

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

Periodo de reporte

01 de Mayo de 2025 al 27 de Mayo de 2025

Objeto del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022

Entidad contratante:

AQUALIA LATINOAMERICA S.A.E.S.P

**Calle: 22D 16 99 OF 01
3146304480**

Montería- Córdoba

E-mail: conintercer@gmail.com

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. CAPITULO I. GENERALIDADES	5
1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	7
2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES	7
3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.....	7
3.1. PAGOS EFECTUADOS	7
3.1.1. ANTICIPOS.....	7
3.2. FACTURACION MENSUAL.....	8
3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO.....	8
3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO	11
3.2.3. RELACION DE GASTOS.....	11
3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.	11
3.3.1. CONTRATO DE OBRA.....	11
3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	12
4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO.....	14
4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA.....	14
4.2. CANTIDADES EJECUTADAS.....	15
4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO).....	21
4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO	22
4.4.1. EN CANTIDADES.....	22
4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS.....	23
4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS	23
4.5.1. PERSONAL.....	23
4.5.2. EQUIPOS	24

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES INTERCER	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.6.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA.....	24
4.6.1.	ACTIVIDADES TÉCNICAS.....	24
4.6.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.....	25
4.6.4.	ACTIVIDADES FINANCIERAS	25
5.	CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS	26
5.1.	MODIFICACIONES.....	26
5.2.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS.....	28
6.1.	ENSAYOS DE LABORATORIO	28
6.2.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.	29
7.	CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN.....	30
8.	CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS.....	30
8.1.	REGISTRO FOTOGRAFICO.....	30
8.2.	ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS.....	30
9.	CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES	30
10.	CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 32	
11.	CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	32
12.	ANEXOS.....	35

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las actividades realizadas en el período de reporte indicado, del Contrato de Obra No Contrato No: AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

objeto es "La ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba".

El informe entrega una visión de las obras, así como las dificultades presentadas, incluyendo componentes técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales de los trabajos ejecutados, la documentación de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría y/o supervisión, para lograr el alcance del contrato, y para atender los eventos imprevistos que hayan podido afectar la normal ejecución de la obra en el plazo determinado, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSORCIO INTERMUNICIPAL	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1. CAPITULO I. GENERALIDADES

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	AQLATAM-ALC-001-2022
objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Valor	\$10.738.195.125
contratante	AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S. P
contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ
Representante legal	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
Fecha de suscripción	11 de enero de 2022
Fecha de inicio	14 de febrero de 2022
Plazo	12 meses
Suspensión N°1	16 de julio de 2022
Reinicio N°1	29 de noviembre de 2022
Suspensión N°2	23 de enero de 2023
Reinicio N°2	15 de febrero de 2023

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES INTERCER	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Suspensión N°3	17 de noviembre de 2023
Reinicio N°3	20 de mayo de 2024
Suspensión N°4	17 de enero de 2025
Reinicio N°4	31 de marzo de 2025
Otrosí No. 2	180 días a partir del 22 de julio de 2023
Otrosí No. 3	150 días a partir del 22 de julio de 2024
Otrosí No. 4	30 días a partir del 19 de diciembre de 2025
Otrosí No.5	60 días a partir del 07 de abril de 2025
Localización de las obras	Sector No 4 municipio de Cerete Córdoba
Alcance del contrato	El contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No AQLATAM-ALC-001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
Estado actual	Terminado

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, lo que contribuye a la fertilidad de sus suelos, y al desarrollo de la agroindustria. Por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente, a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería.



El proyecto se llevará a cabo en el sector 4 etapa II del municipio, con esta intervención a las redes de alcantarillado de este sector, se logrará disminuir los reboses y realizar un manejo adecuado de las aguas residuales mejorando las condiciones de salubridad de las familias de este municipio.

2. CAPITULO II. ASPECTOS CONTRACTURALES Y LEGALES

No aplica para este periodo.

3. CAPITULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

3.1. PAGOS EFECTUADOS

3.1.1. ANTICIPOS

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". No cuenta contractualmente con anticipo.

3.2. FACTURACION MENSUAL

No aplica para este periodo

3.2.1. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

El contrato de obra No. AQLATAM-ALC-001-2022 que tiene por objetivo "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", radicó las siguientes actas parciales de cobro.

- Acta parcial de cobro N° 1 (13.65%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$1.465.334.597,441).
- Acta parcial de cobro N° 2 (17,26%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$1.853.890.979,96).
- Acta parcial de cobro N° 3 (6,82%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$732.598.471,328).
- Acta parcial de cobro N°4 (5.14%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$551.618.296,27).
- Acta parcial de cobro N°5 (7.04%) teniendo en cuenta el valor del contrato es de (\$755.760.994,89).
- Acta parcial de cobro N°6 (5.59%) teniendo en cuenta el valor del contrato es (\$600.023.449,19).
- Acta parcial de cobro N°7(13.69%) teniendo en cuenta el valor del contrato es (\$1.470.014.566,00).
- Acta parcial de cobro N°8 (5.12%) teniendo en cuenta el valor del contrato es (\$549.856.962,39).

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

- Acta parcial de cobro N°9 (15.55%) teniendo en cuenta el valor del contrato es (\$1.670.208.020,07).
- Acta Final de cobro (9.33%) teniendo en cuenta el valor del contrato es (\$1.001.707.163,22).(En Revisión)

CONTROL DE AVANCE Y RESUMEN DE ACTIVIDADES						
						PERIODO DE TRABAJO
						De: 14 de Febrero 2022 A: 26 de Mayo 2025
CAPITULO 1: INFORMACION DEL CONTRATO						
CONTRATO No:		AQLATAM-ALC-001-2022				
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
ENTIDAD CONTRATANTE:		AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P				
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ				
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 10.738.195.125,00		PLAZO (CON PRORROGAS):		
PORCENTAJE ANTICIPO:		0,00%		VALOR ANTICIPO:		\$ 0,00
PARTICIPANTES						
			NIT	901551201-6	PARTICIPACION (% y \$)	
					100,0%	
			TOTAL		100%	
FECHAS	INICIO	SUSPENSION	REINICIO	TERMINACION	MODIFICACION	ADICIONAL
	14-feb-22					
		16-jul-22	29-nov-22			
		23-ene-23	15-feb-23			
		17-nov-23	20-may-24			
		17-Ene-25	31-mar-25			
				26-may-25		
CONTRATO ADICIONAL		VALOR (\$)		PLAZO		VR TOTAL CONTRATO
VALOR ADICIONAL						
ASEGURADORA: SEGUROS						
Nº POLIZA	DESCRIPCION			VIGENCIA		VR ASEGURADO
4005754 Anexo 08	Cumplimiento general			14/02/2022	28/07/2025	\$ 2.147.639.025,00
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales			14/02/2022	26/03/2028	\$ 1.073.819.512,50
	Estabilidad y calidad de la obra			Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 2.147.639.025,00
4001149 - Anexo 08	Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento			11/01/2022	7/06/2025	\$ 1.073.819.513,00

Periodo de reporte:
 Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025



Informe Final

Versión 1
Código
AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CAPITULO 2: INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

ACTAS DE OBRA							
ACTA No	FECHA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	VALOR POR FACTURAR	% POR FACTURAR
1		\$ 1.465.334.597,44	13,65%	0,0	\$ 1.465.334.597,44	\$ 9.272.860.528	86,35%
2		\$ 1.853.890.979,96	17,26%	0,0	\$ 1.853.890.979,96	\$ 7.418.969.548	69,09%
3		\$ 732.598.471,33	6,82%	0,0	\$ 732.598.471,33	\$ 6.686.371.076	62,27%
4		\$ 551.618.296,27	5,14%	0,0	\$ 551.618.296,27	\$ 6.134.752.780	57,13%
5		\$ 755.760.994,89	7,04%	0,0	\$ 755.760.994,89	\$ 5.378.991.785	50,09%
6		\$ 600.023.449,19	5,59%	0,0	\$ 600.023.449,19	\$ 4.778.968.336	44,50%
7		\$ 1.470.014.566,00	13,69%	0,0	\$ 1.470.014.566,00	\$ 3.308.953.770	30,81%
8		\$ 549.856.962,38	5,120%	0,0	\$ 549.856.962,38	\$ 2.759.096.808	25,69%
9		\$ 1.670.208.020,07	15,55%	0,0	\$ 1.670.208.020,07	\$ 1.088.888.787	10,14%
10		\$ 1.001.707.163,22	9,33%	0,0	\$ 1.001.707.163,22	\$ 87.181.624	0,81%
TOTALES		\$ 10.651.013.501	99,19%	0,0	10.651.013.500,75	87.181.624,3	0,81%

ACTAS DE REAJUSTES					
ACTA DE REAJUSTE No	FECHA	VALOR AJUSTADO	% DE AJUSTE/ACTA PARCIAL	VALOR AJUSTADO ACOMULADO	% DEL VALOR DEL CONTRATO
1					
2					
3					

RESUMEN DE FACTURACION DEL CONTRATO			PORCENTAJE CONSTRUIDO		99,19%
FACTURADO ACUMULADO	\$ 10.651.013.500,75	99,19%	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$	10.651.013.500,75
POR FACTURAR	\$ 87.181.624,25	0,81%			

CAPITULO 3: INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - PROPIOS					
DESCRIPCION	TIPO	CANTIDAD	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	MAL ESTADO
Compactador Canguro Con Operador		1,00	X		
Retroexcavadora		2,00	X		
Equipo de Elevación Diferencial		2,00	X		

Fecha de Entrega de informe: Mayo 2025		CARGO	FIRMA
ELABORÓ	John Antonio Martínez Aguilar	Rep. Legal	
REVISÓ			

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

3.2.2. ESTADO Y CUENTAS DEL PROYECTO

No aplica para este periodo

3.2.3. RELACION DE GASTOS

No aplica para este periodo

3.3. POLIZAS DE LOS CONTRATOS Y EXTRACTOS DE LAS VIGENCIAS DE ESTAS.

3.3.1. CONTRATO DE OBRA

EL CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE, contratista del proyecto que tiene por objeto "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Tiene al día todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENTE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	x		\$2.147.819.512
Buen manejo del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el	100% del monto pagado de forma anticipada			

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSORCIO INTER	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato	100% del valor del contrato	x		\$1.073.819.512
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco años contando a partir de la suscripción del acta de liquidación final	20% del valor del contrato	x		\$2.147.639.025

3.3.2. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ contratista de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Se encuentra al día con todas las garantías requeridas acorde a lo exigido en los pliegos de condiciones, esto es:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	CUMPLE		VALOR
			si	no	
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se imponga	Hasta la liquidación del contrato	20% del valor del contrato	X		\$147.709.121.63
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato	100% del valor del contrato			
Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o de la entrega de todos los bienes o servicios asociados al anticipo	100% del monto pagado de forma anticipada			
Pago de salarios, prestaciones	Plazo del contrato	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.					
calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Plazo de contrato y seis meses mas	10% del valor del contrato	X		\$73.854.560.81

4. CAPITULO IV: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

4.1. CONTROLES DE EJECUCION EN LA OBRA

Avance de las actividades ejecutadas, por capítulos.

REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR No. 4		
ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS
2	Actividades preliminares	Localización, trazado y replanteo
3	Excavaciones	Excavaciones red h=<2.50, Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.5 y excavaciones manuales
4	Demoliciones	
5	Entibados	Entibado tablestacado con lamina
6	Retiro y disposición de material	Cargue, retiro y disposición de material proveniente de excavaciones

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

7	Rellenos	Material proveniente de la excavación, recebo común, triturado, grava, piedra rajón, y subbase granular.
8	Redes de alcantarillado	Instalación y suministro de tubería flexible de alcantarillado D8" (200mm) - D10" (250mm)
9	Pozos de inspección y cámara de caída	Base para pozo, Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,2 y Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa
10	Domiciliarias de alcantarillado	Instalación de tubería y accesorios domiciliaria 6", Codo 45° PVC 160mm Y Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevador es hidrosellos, Yee PVC 200x160mm
12	Intervención de espacio publico	Mejoramiento de vías
13	Instalación y suministro de concretos	Instalación para atraque de tuberías y concretos de resistencia
17	Instalación tubería sin zanja	Ramming para cruces especiales
	Suministros	Tubo PVC alcantarillado 160 mm Tubo PVC alcantarillado 200 mm Tubo PVC alcantarillado 250 mm

4.2. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	BALANCE FINAL	CANTIDAD EJECUTADA
2	Actividades premilitares			
2 01	Localización y replanteo redes	ML	12551.20	852.19
3	Excavaciones			
3 01	Excavaciones mecánica red h=< 2.50mts	M3	22011.82	1563.85

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES INTERCER	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

3 02	Excavaciones mecánica red h>2.50<5.00mts	M3	10547.20	
3 03	Excavaciones mecánica red h=>5.00mts	M3	0	
3 04	Excavaciones mecánica estructuras h=< 2.50mts	M3	1258.44	130.34
3 05	Excavaciones mecánica estructuras h>2.50<5.00mts	M3	398.20	
3 06	Excavaciones mecánica estructuras h=>5.00mts	M3	0	
3 07	Excavación manual	M3	17277.99	1044.79
4	Demoliciones			
4 03	Demolición de andenes	M2	958.22	169.95
4 04	Demolición de sardineles	MI	958.22	169.95
4 05	Demolición de pavimentos flexibles	M3	0	
4 06	Demolición de pavimento rígido	M3	533.27	
5	Entibados			
5 02	Entibado tablestacado con madera	M2	0	
5 03	Entibado tablestacado con lamina	M2	38646.71	1102.89
6	Retiro y disposición de material sobrante			
6 01	Cargue, Retiro y disposición de material proveniente de excavaciones	M3-KM	257369.92	2475.77
7	Rellenos			
7 01	Material proveniente de la excavación	M3	17728,23	1049,17
7 02	Recebo común	M3	23747,08	1134,50
7 04	Triturado <= 1"	M3	1862,59	139,51
7 05	Grava >1"	M3	2727,34	153,39
7 06	Piedra rajón	M3	2570,56	171,99
7 08	Subbase granular	M3	519,09	

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

7 09	Base granular	M3	0	
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 01 06	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8"(200 mm)	MI	10424,37	802.99
8 01 01 07	Instalación tubería flexible alcantarillado D10"(250 mm)	MI	846,11	49.20
8 01 01 08	Instalación tubería flexible alcantarillado D 12"(315 mm)	MI	461,00	
8 01 01 09	Instalación tubería flexible alcantarillado D 16"(400 mm)	MI	638,64	
8 01 01 10	Instalación tubería flexible alcantarillado D 18"(450mm)	MI	181,13	
8 01 01 11	Instalación tubería flexible alcantarillado D 20" (500 mm)	MI	10424,37	
8 01 01 12	Instalación tubería flexible alcantarillado D 24"	MI	0	
9	Pozos de inspección y cámara de caída			
9 01	Pozos de inspección			
9 01 01	Elementos pozo de inspección contruidos en sitio			
9 01 01 01	Base para pozo	Un	207	18
9 01 01 03	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25	MI	331.02	32.59

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

9 01 01 09	Tapa cubierta pozo + aro-base + aro-tapa	Un	207	18
10	Domiciliarias de alcantarillado			
10 01	Instalaciones domiciliarias			
10 01 01	Instalación tubería y accesorios domiciliaria 6"	MI	11914	640.80
10 02	Suministro accesorios domiciliarias			
10 02 01	Suministro e Instalación Yee PVC			
10 02 01 01	yee PVC 200x160mm	Un	1369	98
10 02 01 02	yee PVC 250x160mm	Un	110	8
10 02 01 03	yee PVC 315x160mm	Un	14	
10 02 01 07	yee PVC 400x160mm	Un	0	
10 02 01 09	yee PVC 450x160mm	Un	55	
10 02 01 11	yee PVC 500x160mm	Un	0	
10 02 01 13	yee PVC 24" x160mm	Un	0	
10 02 03	Suministro de codo PVC			
10 02 03 01	Codo 45° PVC 160mm	Un	777	
10 03	Caja de inspección domiciliaria			
10 03 01	Caja domiciliaria plástica, incluye tapa, elevadores hidrosellos	Un	1548	106
12	Intervención de espacio publico			
12 01	Pavimentos			
12 01 01	Construcción de pavimentos flexible			
12 01 01 01	Imprimación	M2	0	

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

12 01	Construcción base	M3	0	
01 02	asfáltica			
12 01	Construcción rodadura	M3	0	
01 03	asfáltica			
12 01	Sellado de junta asfalto	MI	0	
01 04				
12 01	Construcción de pavimento rígido			
02				
12 01	Pavimento rígido MR 43	M3	533.27	
02 01				
12 02	Construcción de andenes			
12 02	Anden en concreto e=	M2	958.22	169.95
01	0.12mts			
12 03	Construcción de sardinel			
12 03	Construcción sardinel	MI	958.22	169.95
01	50cm			
12 03	Construcción sardinel	MI	0	
02	35cm			
13	Instalación y suministro de concretos			
13 01	Instalación de concretos			
13 01	Instalación concreto para	M3	116.50	17.10
03	atraque tubería			
13 02	Suministro de concretos			
13 02	Concreto resistencia 21,0	M3	116.50	17.10
05	Mpa (210 kg/cm ²)			
17	Instalación tubería sin zanja			
17 06	Perforación ramming hierro 8", Paso Sub- terrenoTub. 8" sanitario vía Cerete-Montería	MI	50	
SUMINISTROS				
8	Redes de alcantarillado			
8 01	Instalación y suministro de tubería de alcantarillado			

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES INTERCER	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

8 01 01	Instalación de tubería flexible de alcantarillado			
8 01 02	Suministro de tubería de alcantarillado			
8 01 02 01	Suministro tubería PVC alcantarillado			
8 01 02 01 01	Tubo PVC alcantarillado 160mm	MI	11953,00	640.80
8 01 02 01 02	Tubo PVC alcantarillado 200mm	MI	10424,37	802.99
8 01 02 01 03	Tubo PVC alcantarillado 250mm	MI	846,11	49.20
8 01 02 01 04	Tubo PVC alcantarillado 315mm	MI	461,00	
8 01 02 01 06	Tubo PVC alcantarillado 400mm	MI	0	
8 01 02 01 07	Tubo PVC alcantarillado 450mm	MI	638.64	
8 01 02 01 08	Tubo PVC alcantarillado 500mm	MI	181.13	
8 01 02 01	Tubo PVC alcantarillado 24"	MI		

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022


Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

09			
----	--	--	--

4.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRAS (AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO)

Ver cuadro Estado de Avance de Físico de la Obra.

ESTADO DE AVANCE FISICO DE OBRA

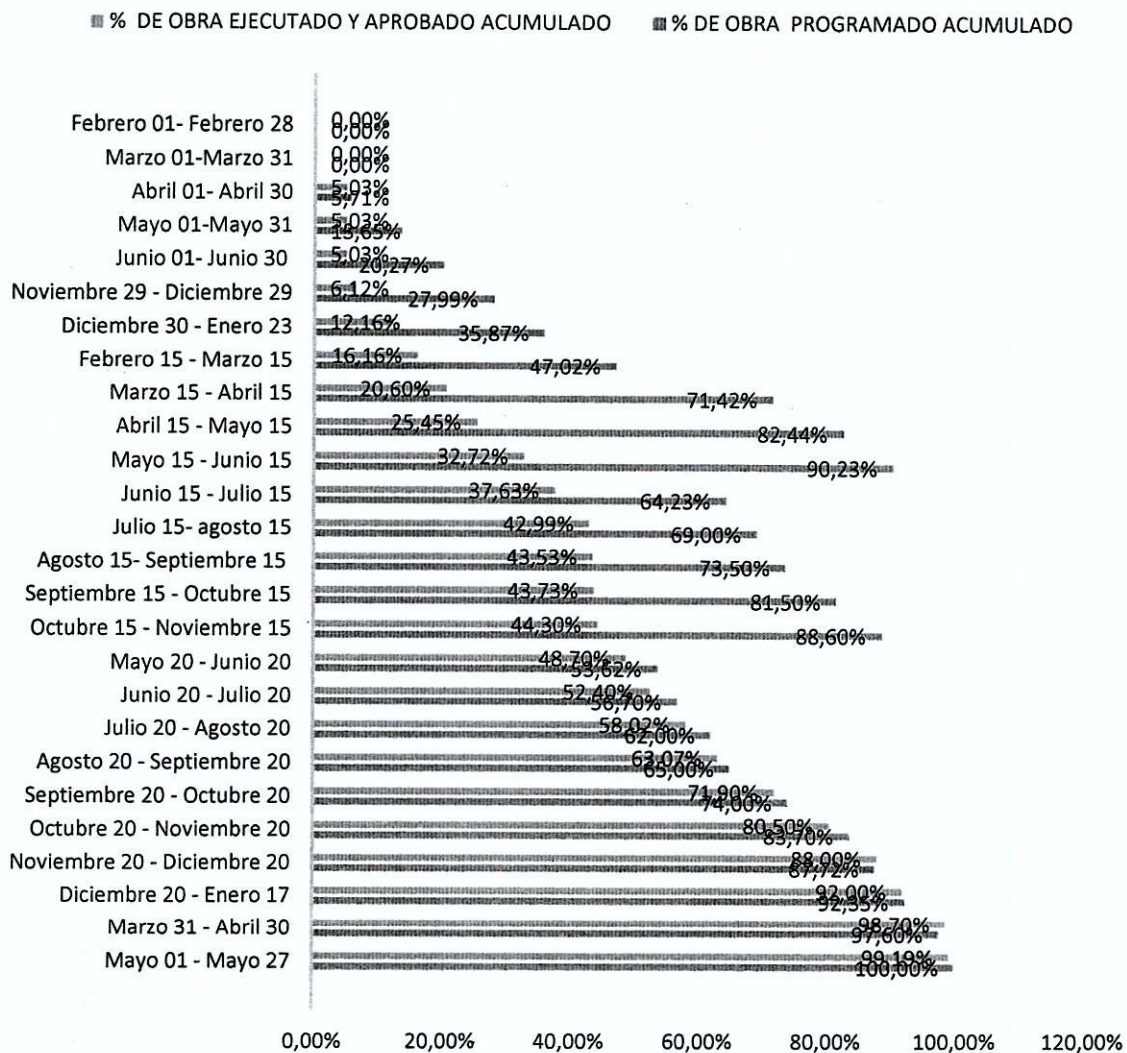

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 onintercer CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.4. MODIFICACION DEL PROYECTO

4.4.1.EN CANTIDADES

El día 22 de febrero de 2024 con radicado 20243040064171 la Agencia Nacional de Infraestructura ANI concedió viabilidad al permiso de dos cruces de vía que conecta el municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.

Una vez obtenido el permiso y a solicitud del Ministerio de Vivienda y Territorio, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P procedió a realizar la verificación del balance de mayores y menores cantidades que sería soporte para el proceso de solicitud de reformulación No.2, dado al cambio de vigencia (2023 – 2024).

El 05 de abril de 2024 mediante oficio con identificación 2-140-0207- 2024 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P y radicado de MVCT 2024ER0043617, se solicitó al Viceministerio de agua y saneamiento básico la reformulación No.2 del Proyecto debido a consideraciones técnicas evaluadas en campo.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto, para lo cual están dadas las condiciones para reiniciar las contrataciones derivadas de obra e interventoría.

REFORMULACIÓN III:

El día 03 de diciembre de 2024 mediante radicado 2024ER0193789 se presentó ante el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio con el aval del Municipio de Cereté la solicitud de la reformulación No. 3 para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" en el marco del convenio CUR 1072 de 2021.

Luego de mesas técnicas, revisión documental y toda la revisión y evaluación pertinente, el día 18 de marzo de 2025 desde la subdirección de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estableció "nos permitimos informarle que una vez revisados los soportes remitidos y cumplidos los requisitos establecidos en el capítulo V de la Resolución Nro. 0661 de 2019, los ajustes técnicos solicitados fueron presentados ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la sesión Nro. 04 del 7 de marzo de 2025, el cual recomendó su aprobación."

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSORCIO INTERMUNICIPAL	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.4.2. EN PRECIOS UNITARIOS

No aplica para este mes

4.5. PERSONAL, EQUIPO Y ADMINISTRACION UTILIZADO POR EL CONTRATISTA EN OBRAS

4.5.1. PERSONAL

La obra cuenta con el personal mínimo requerido, esto es:

CANTIDAD	CARGO/PROFESION	%DE DEDICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Director de obra	100	x		
1	Residente de obra	100	x		
1	Especialista hidráulico	50	x		
1	Especialista en geotecnia	50	x		
1	Inspector de obra	100	x		
1	Profesional social	100	x		
1	Secretario	50	x		

Adicional al personal mínimo requerido y el administrativo el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, ha incorporado un personal adicional en el área operativa, requerido para la verificación del desarrollo del proyecto, entre los que se citan:

CANT	CARGO/PROFESION	% DE DECICACION	CUMPLE		OBSERVACIONES
			si	no	
1	Topógrafo	100	x		
1	Cadenero	100	x		

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Todo el personal en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, esto es: ARL, AFP Y EPS.

4.5.2. EQUIPOS

El CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE, cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA	CANTIDAD	EN BUEN ESTADO		OBSERVACIONES
		si	no	
Retroexcavadora		x		
Equipo de elevación diferencial		x		
Compactador con operador		x		
Volqueta de 7m3		x		

4.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

4.6.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el contratista CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ, en el presente periodo, estuvo a cargo de personal dispuesto por la interventoría. Se realizaron todas las inspecciones a través de un equipo multidisciplinario que acompañó diariamente el desarrollo de actividades realizadas por el ejecutor CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ; se registró la información mediante informes semanales como así también en el presente informe mensual.

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

4.6.2.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- **Recursos Empleados:** La interventoría en el presente periodo dispuso, administró y mantuvo en la obra el personal profesional, técnico y administrativo; para el progreso de las funciones y compromisos adquiridos en el contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022.

4.6.3.SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría en el presente periodo realizó seguimiento al avance físico-financiero y revisión del presupuesto de obra donde se verificó la ejecución de las actividades correspondientes.

- **Elaboración de informes semanales del periodo en ejecución:** De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022; se realizó el informe mensual en el presente periodo, entre el 01 de mayo del 2025 al 27 de mayo del 2025; como así también, los informes semanales presentados ante la entidad contratante.
- **Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social:** La interventoría en el presente periodo verificó en cumplimiento de la afiliación de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- **Diario de Obra (Bitácora):** Se lleva un registro diario de las actividades realizadas en campo, dicho libro se lleva junto con contratista, donde se lleva un registro y control de lo ejecutado en obra en el sector 4 del municipio de cerete Córdoba.

4.6.4.ACTIVIDADES FINANCIERAS

Semanalmente la interventoría revisa el avance en la ejecución de las labores desarrolladas por el contratista de acuerdo con los ítems que forman parte del presupuesto de obra que corresponden al entre el 01 de mayo del 2025 al 27 de mayo del 2025, contrastando la obra ejecutada con la programación tal y como se reporta en los informes semanales. Se adjunta Matriz de Seguimiento Obligaciones Contractuales de la Interventoría.

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUYENDO LA CALIDAD	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

5. CAPITULO V: ASPECTOS TECNICOS

5.1. MODIFICACIONES

El día 03 de diciembre de 2024, mediante radicado 2024ER0193789, se presentó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el aval del Municipio de Cereté, la solicitud de la Reformulación No. 3 para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", en el marco del Convenio CUR 1072 de 2021.

Las modificaciones planteadas son las siguientes:

- **REDUCCIÓN DE PROFUNDIDAD COLECTOR SECUNDARIO**

Esta modificación surgió como respuesta a un imprevisto durante la excavación para instalar el colector de 8" en el tramo comprendido entre los pozos MH IVCD 10A y MH IVCD 11. Durante estas labores, se interceptó el colector principal existente de 20", ubicado por debajo del trazado diseñado, evidenciando un impedimento físico para instalar el colector de 8" a la profundidad y pendiente previstas.

Constructivamente, no es viable mantener las cotas de diseño inicial.

La opción planteada por el contratista y avalada por la interventoría consiste en reducir la profundidad de instalación del nuevo colector, incrementando las cotas clave, pero manteniendo la pendiente suficiente para garantizar los criterios de fuerza tractiva y velocidad de flujo requeridos.

- **EXCLUSIÓN DE VIVIENDAS NO NORMALIZADAS**

Con esta actividad se ajusta el alcance del proyecto para asegurar el cumplimiento de los requisitos urbanos exigidos para la incorporación de nuevos usuarios al sistema de alcantarillado.

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Durante el replanteo topográfico y revisión del diseño, se identificaron viviendas que no cuentan con estado “normalizado” en los registros de planeación municipal. Al no encontrarse regularizados, estos predios no pueden ser objeto de conexión al sistema, por lo que se excluyen del proyecto.

- **EXCLUSIÓN DE COLECTORES TRAZADOS SOBRE VÍAS PRIVADAS**

Esta exclusión tiene como finalidad ajustar el alcance del proyecto conforme a los criterios normativos sobre la ejecución de infraestructura pública.

Durante la revisión, se evidenció que el tramo de vía comprendido entre los pozos MH S112 y S114 no pertenece a la red vial pública, lo que constituye un impedimento jurídico y técnico para la ejecución de las obras, por lo que dicho trazado se excluye de manera definitiva.

- **INCLUSIÓN DE NUEVOS TRAZADOS**

Durante la ejecución del proyecto se identificaron diferentes vías del sector con cerca de 47 viviendas no incluidas originalmente en el alcance.

Considerando la exclusión de algunos tramos y usuarios por incumplimiento de requisitos normativos, se propone la incorporación de nuevos tramos de colectores, lo que permitirá atender a estas viviendas y optimizar el alcance efectivo del proyecto.

Finalmente, luego de varias mesas técnicas, revisión documental y análisis por parte de los actores involucrados, el día 18 de marzo de 2025, la Subdirección de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió el siguiente pronunciamiento:

“Nos permitimos informarle que una vez revisados los soportes remitidos y cumplidos los requisitos establecidos en el Capítulo V de la Resolución Nro. 0661 de 2019, los ajustes técnicos solicitados fueron presentados ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la sesión Nro. 04 del 7 de marzo de 2025, el cual recomendó su aprobación.”

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSORCIO INTERCOMUNAL DE SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

• BALANCE FINAL DE CANTIDADES DE OBRA

Adicionalmente, en el marco del proceso de finalización del proyecto, se realizó un balance final de obras y cantidades, con el objetivo de consolidar el alcance definitivo de los trabajos ejecutados, considerando los ajustes derivados de la Reformulación No. 3 y de las condiciones encontradas durante la ejecución final.

Este balance fue presentado por el contratista de obra, y posteriormente revisado y aprobado por la interventoría y la supervisión, garantizando la trazabilidad técnica y administrativa de los cambios implementados y permitiendo cerrar el proyecto con una visión clara y ajustada a la realidad de campo.

5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

No aplica para este periodo

6. CAPITULO VI: CONTROL DE CALIDAD

6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO

El ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ entregó pruebas de ensayo de laboratorio de la resistencia del concreto, este documento es crucial para determinar la calidad y la capacidad de carga del concreto utilizado en el pavimento del sector Z4, así como también, resistencia y compresión de cilindros de concreto para los pozos de inspección.

6.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON LA CALIDAD DE OBRA.

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUYENDO LA PAZ	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

La resistencia del concreto es uno de los aspectos más importantes que deben ser evaluados en su proceso constructivo.

Contratista entrego pruebas de ensayo de laboratorio por flexión. Este ensayo se utiliza para medir la resistencia del concreto a la flexión.

Este ensayo se hace en un tramo de pavimento de concreto con una longitud considerable con el mismo equipo de colocación, la misma velocidad, el mismo espesor y la misma mano de obra que va a construir el pavimento.

Este tramo de pavimento tiene varios objetivos:

- A) Verificar las condiciones de la mezcla de concreto.
- B) Verificar las condiciones de los equipos de colocación, vibración, compactación y el kit de terminación del pavimento.
- C) Verificar el espesor del pavimento.
- D) Verificar uniformidad y regularidad de la superficie establecida.
- E) Revisar el método de protección y curado del concreto.
- F) Ajustar la ventana de corte de juntas.
- G) Ajustar en el proceso de sellado de juntas.
- H) Definir la correlación entre la compresión de los cilindros de concreto y la flexión de viguetas, así como los criterios de aceptación de núcleos de concreto.

Adicional a ello contratista manifiesta mediante oficio OFIC-ALC-CCC-041 que todos los concretos utilizados en la construcción de pavimento de la principal del estadio son concretos premezclados, por lo cual se aumenta la garantía en la calidad de los mismos.

7. CAPITULO VII: DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA Y COMPORTAMIENTO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN

Observaciones:

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 onintercer CONSORCIO INTERCOMUNAL DE SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

En el presente periodo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación III del Proyecto.

8. CAPITULO VIII: ASPECTOS VARIOS

8.1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta registro fotográfico de la ejecución de los trabajos en el sector N°4 del municipio de Cereté – Córdoba.

8.2. ACTAS, OFICIOS, COMUNICACIONES Y DEMAS REQUERIMIENTOS

Se anexan las actas, comunicaciones y demás requerimientos.

9. CAPITULO IX: ASPECTOS AMBIENTALES

Se ha evidenciado que el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, ha continuado laborando en los aspectos e impactos ambientales definidos en el plan de manejo ambiental estipulado para el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Ajustándose a la normativa ambiental vigente.

Hasta la fecha y con base a la etapa en que se encuentra el proyecto, los aspectos e impactos ambientales que se han identificado y se vienen trabajando son los siguiente:

- **Contratación de Personal:** Se pudo evidenciar que cuenta con una mínima cantidad de personal en obra, nativo de la zona de influencia del proyecto, y el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ espera que este número vaya aumentando en la medida en que avance el proyecto, con el fin de contribuir así a la generación de empleo en la región y que contribuya al mejoramiento de su economía.
- **Incremento de Demanda de Bienes y Servicios:** Se evidencia el incremento de este aspecto, principalmente dado que el CONSORCIO

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONSTRUREDES CERETÉ continua con la contratación de servicios, afectándole de forma positiva, ya que es importante para la comunidad local ofrecer servicios y bienes, generándoles un beneficio económico.

- Generación de Empleo: A la fecha, el total de personal contratado en el proyecto es de la zona de influencia del proyecto.
- Alteración en la Calidad Visual: Este impacto es general para todo el proyecto, el cual se define con incidencia directa, negativo, seguro, de intensidad media, de duración permanente, puntual, es mitigable y compensable.
- Perdida de suelos: Se han presentado cortes del terreno, pero hay que tener en cuenta que este impacto es general para todo el proyecto, por lo cual se define como incidencia directa. Negativo, de intensidad alta, de duración parcial, no es mitigable, pero si compensable.
- Cambios en la Calidad del Aire: Este impacto es evidente dado el inicio de los trabajos y el tráfico vehicular que este está generando en la zona. Este impacto es general en el proyecto, es directo, negativo, seguro, con una intensidad media, de duración temporal, local, es mitigable pero no compensable.

10. CAPITULO X: ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se evidenció que el CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ, ha realizado la identificación de los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en cada actividad de obra, los cuales están consignados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos; teniendo en cuenta el riesgo asociado y las consecuencias o daños que podría causar en la salud y en el patrimonio de las personas.

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer TRANSACCIONES S.A.S.	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

Para aquellos riesgos no aceptables, el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ procedió a definir procedimientos operativos o planes de acción que mantengan bajo control el peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad.

Durante la ejecución de la obra, los registros diarios son consignados en la Bitácora y en el formato "Plan de Control de Peligros y Riesgos", incluyendo siempre la firma de la Interventoría. Se lleva también un registro fotográfico de esta información.

Se evidenció también que el CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ, en la etapa inicial de la obra, ha trabajado en las siguientes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN Y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.

- Entrega de EPP.
- Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
- Capacitaciones de Bioseguridad y de Seguridad en la Obra.
- Afiliación al personal de la obra al sistema de seguridad social (ARL, PENSIÓN, EPS y PARAFISCALES).

11. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Tras la evaluación y supervisión detallada de la ejecución del contrato de obra, se emiten las siguientes conclusiones, las cuales consolidan el estado técnico, administrativo, financiero y operativo del proyecto:

1. Avance Físico y Financiero del Proyecto

El avance físico global de obra ejecutada al cierre del contrato alcanza un 99.19%, lo cual representa una ejecución financiera de \$10.651.013.501.

Se registra un saldo de recursos no ejecutados correspondiente a un valor de \$87.181.624,67, lo que representa un bajo porcentaje residual del

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

112

 Conintercer CONSTRUCCIONES INTERCER	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ANEXOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES CONTRAFACTUALES	FECHA DE REVISION	CUMPLE		OBSERVACIONES
		Si	No	
1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y áreas definidas para el proyecto.	Mayo de 2025	x		Se hizo un recorrido inicial previo a iniciar actividades en acompañamiento con el contratista y AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P, registrado en el informe semanal 1.
2. Designar, un Ingeniero Residente, que será su representante en las obras, y quien deberá tener autonomía para actuar por su cuenta.	Mayo de 2025	x		Se asigna a la ingeniera Aura Patricia Pérez García como residente de interventoría desde el presente corte de actividades, la cual ha hecho seguimiento de esta hasta el presente periodo.
3. La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el Departamento estén de acuerdo con las condiciones actuales.	Mayo de 2025	x		La interventoría ha hecho acompañamiento a AQUALIA LATINOAMERICA S.A en la revisión de diseños
4. El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales de los mismos.	Mayo de 2025	x		La interventoría analiza todos los documentos correspondientes al proyecto.
5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el manual elaborado por el contratista.	Mayo de 2025	x		La interventoría ha asignado un profesional SST para llevar un plan de seguridad y salud en la Obra.
6. Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. Teniendo en cuenta la	Mayo de 2025	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos.				informativa la cual fue instalada el día 1 de febrero acorde al modelo entregado.
7. Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. Los resultados y observaciones de estos se consignarán en el informe quincenal que presentará el Interventor a la entidad.	Mayo de 2025			No aplica para este mes
8. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., requieran verificación.	Mayo de 2025			El ejecutor CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ entregó pruebas de ensayo de laboratorio de la resistencia del concreto. Los resultados obtenidos en los ensayos fueron revisados, evaluados y aprobados por la supervisión.
9. El contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. le solicite, con el fin de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos preliminarmente.	Mayo de 2025	x		No aplica para este periodo
10. Analizar para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., y previa su autorización, de forma conjunta con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales de construcción y procesos constructivos.	Mayo de 2025			No aplica para este mes
11. Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.	Mayo de 2025	x		La interventoría ha supervisado que las Actividades que se ejecuten estén acorde con el diseño y cumpliendo las especificaciones técnicas entregadas por el contrato. El proyecto se encuentra en reformulación III ante MVCT.
12. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas las fases del contrato.	Mayo de 2025	x		No aplica para este mes
13. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., mínimo con	Mayo de 2025	x		No aplica para este mes

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. la determinación final.				
14. Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del contrato intervenido.	Mayo de 2025	x		
15. Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del Coordinador de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., el nuevo programa de trabajo.	Mayo de 2025	x		La interventora realiza seguimiento y control durante toda la ejecución del proyecto, validando el cumplimiento en avance físicos contra los avances programados para el desarrollo del proyecto.
16. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor previa información al respecto a la AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.	Mayo de 2025			No aplica para este mes
17. Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro del equipo del Contratista; sin embargo, informará a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes quincenales y final de Interventoría.	Mayo de 2025	x		
18. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, teniendo en	Mayo de 2025	x		No aplica para este periodo

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Departamento.				
19. En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, presentando a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. el resultado de dichas evaluaciones para que esta conceptúe su viabilidad o no.	Mayo de 2025			El presente proyecto cuenta con reformulación III aprobada ante MVCT
20. Elaborar un informe mensual para la entidad y enviarlo dentro de los diez primeros días del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., la cual estará incluida en el Informe quincenal.	Mayo de 2025	x		La interventoría realiza la entrega mensualmente del informe de interventoría a la entidad contratante AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P
21. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obras con los Contratistas o su representante. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los	Mayo de 2025			Se realizaron comités de obra de seguimiento final del proyecto para la presente etapa.

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se consignarán en el acta de la reunión.				
22. Elaborar y suscribir, juntamente con AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos.	Mayo de 2025			No aplica para este mes
23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.	Mayo de 2025	x		La interventoría cuenta con el personal administrativo que controla a diario el presupuesto de la obra.
24. Prestar apoyo a AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.	Mayo de 2025			No aplica para este mes
25. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto.	Mayo de 2025	x		La interventoría ha exigido al contratista el uso de señalizaciones, así como la valla informativa la cual fue instalada el día 11 de febrero acorde al modelo entregado.
26. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto bueno de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	Mayo de 2025			No aplica para este periodo
27. El Interventor, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P. y los Contratistas, efectuarán una inspección final a las obras, una semana antes de ser entregadas las con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo para AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P., en donde se describa el balance				Se realizaron visitas, recorridos e inspecciones de obras en compañía de la supervisión para validar todo el desarrollo de la obra y el alcance final de la misma. Se realizó balance final de obra donde el contratista terminó actividades en un porcentaje del 99.19%, donde el

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUYENDO LA PAZ	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia de AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los pagos finales.	Mayo de 2025			restante son fondos para devolver a la nación por no haberse ejecutado.
28. Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes quincenales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra semana a semana, Informe Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.. El informe deberá contener las recomendaciones	Mayo de 2025			Aplica para este periodo.

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características principales. El Contratista y La Empresa contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.				
--	--	--	--	--

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022



Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

	
Descripción:	Excavaciones mecánica red h=<2.50
Fecha:	01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

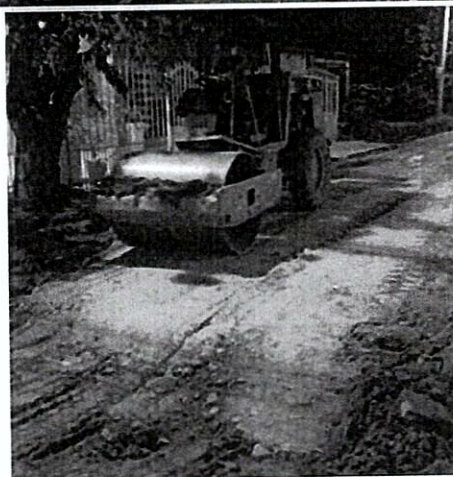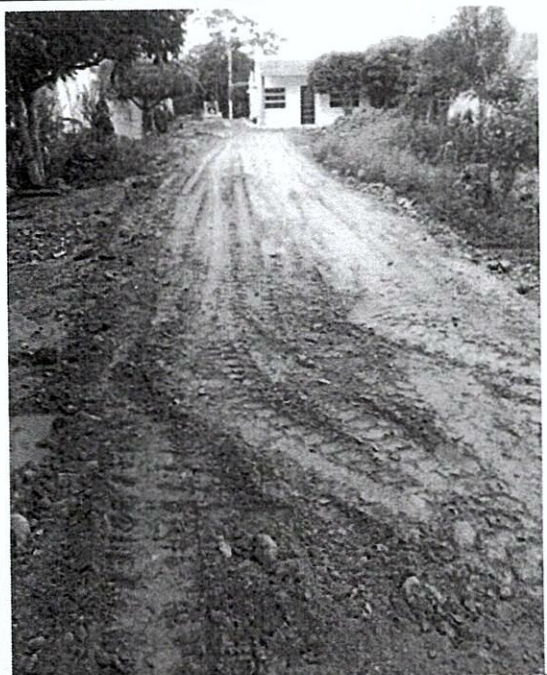



Descripción:	Relleno y mejoramiento de vías
Fecha:	01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté


 **Conintercer**
CONSTRUCCIONES INTER 24

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

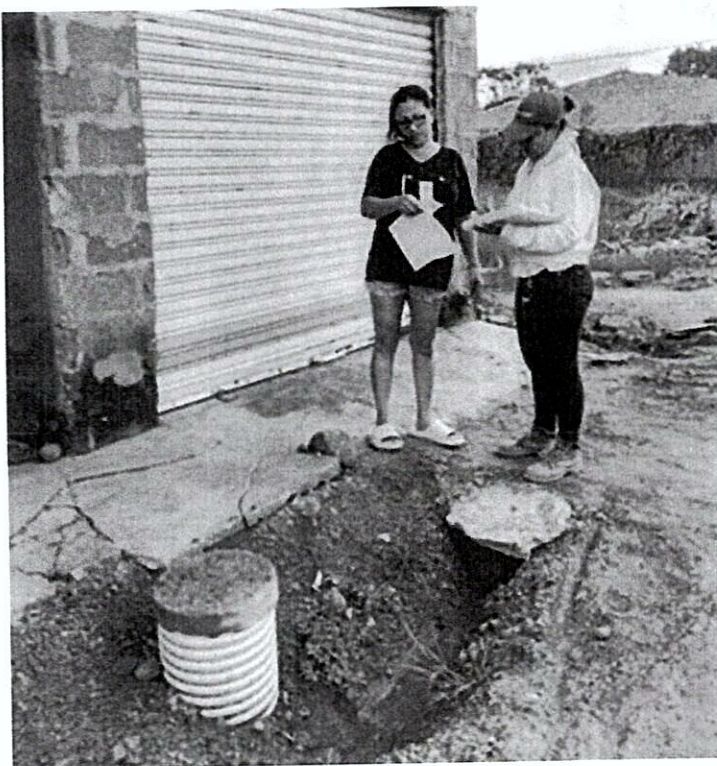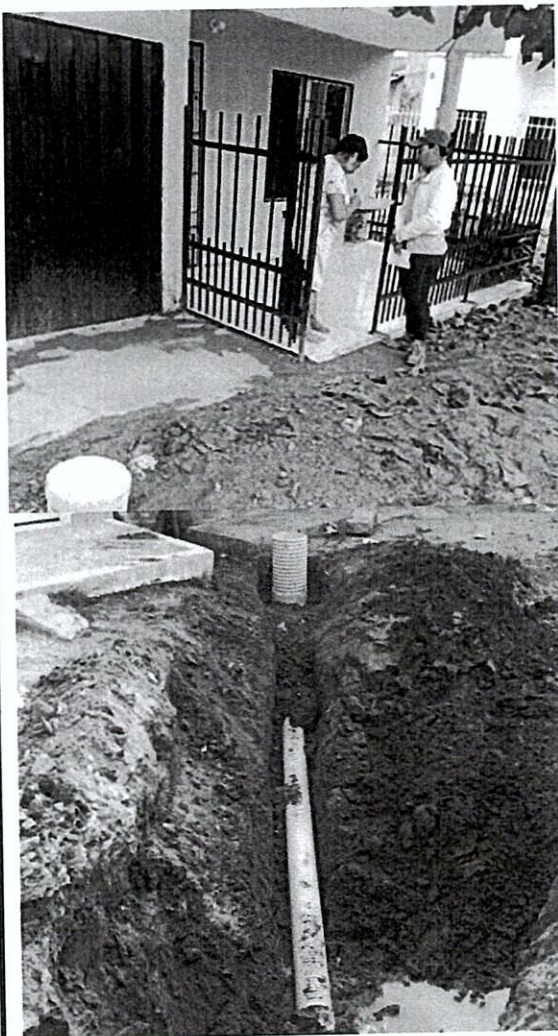


Descripción:	Caja domiciliaria plastica, incluye tapa, elevador e hidrosellos
Fecha:	01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025
Ubicacion:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

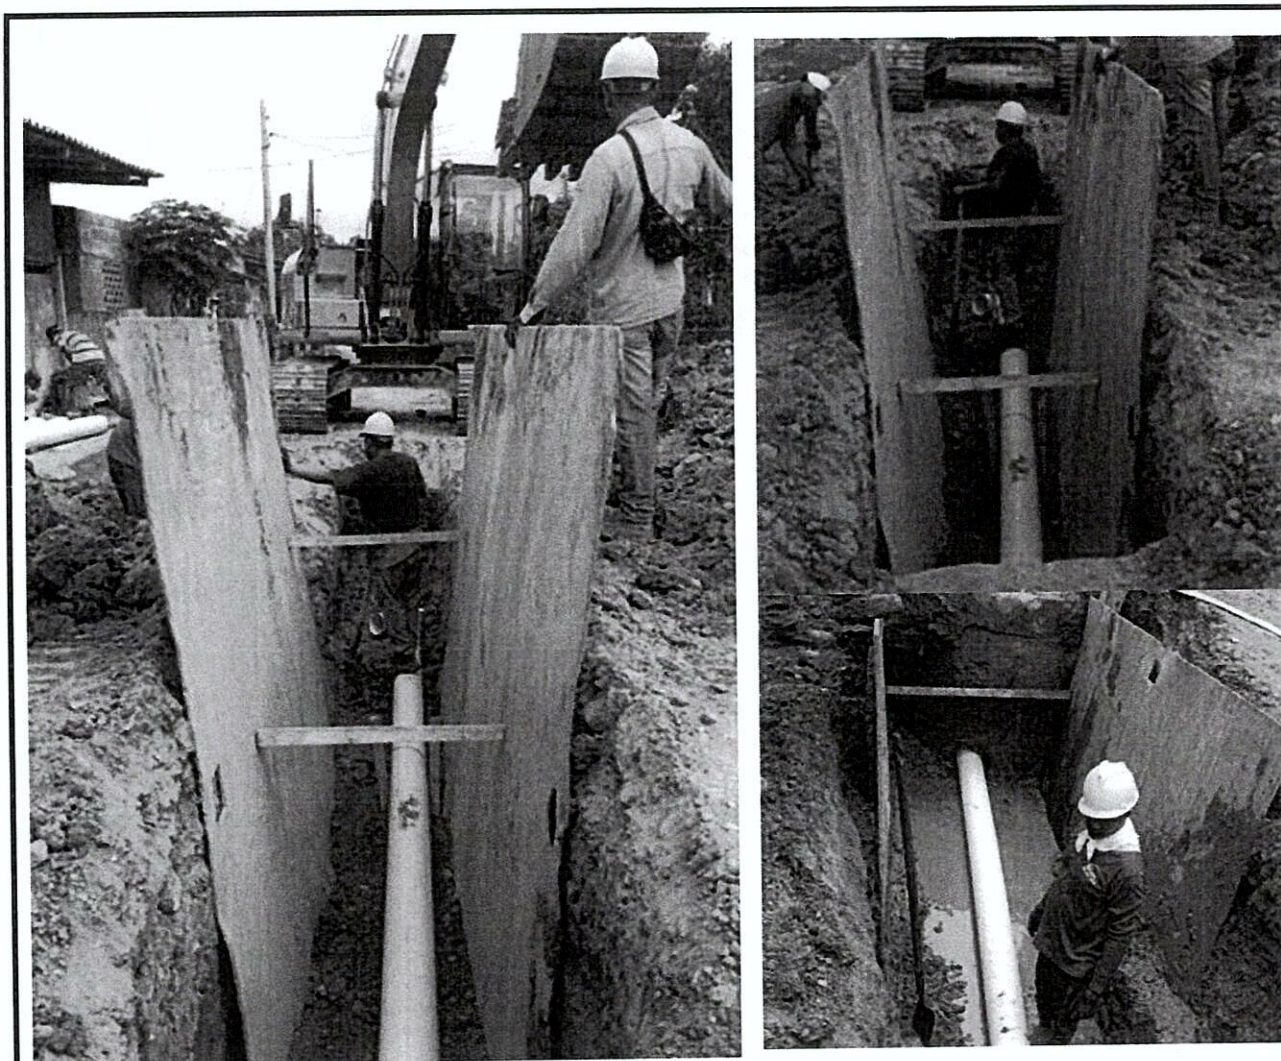

Descripción:	Entibado tablestacado con lamina
Fecha:	01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté



Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Descripción:

Base para Pozo

Fecha:

01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025

Ubicación:

Sector N°4, Municipio de Cereté

 **Conintercer**
CONSORCIO INTER 24


Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

37

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba




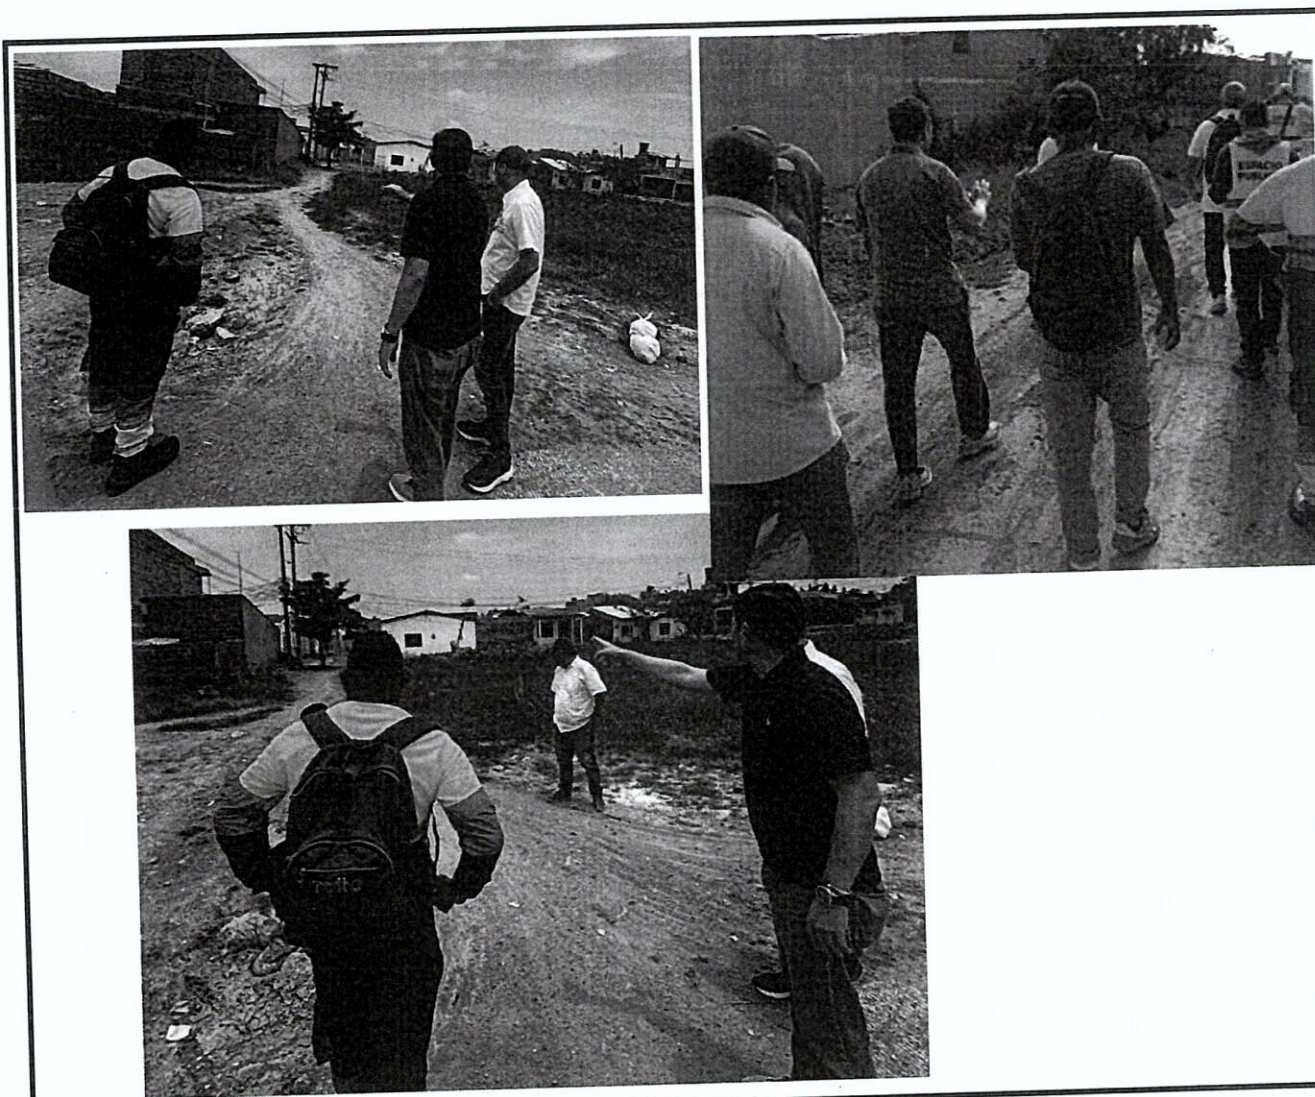


Descripción:	Recorrido en campo
Fecha:	01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

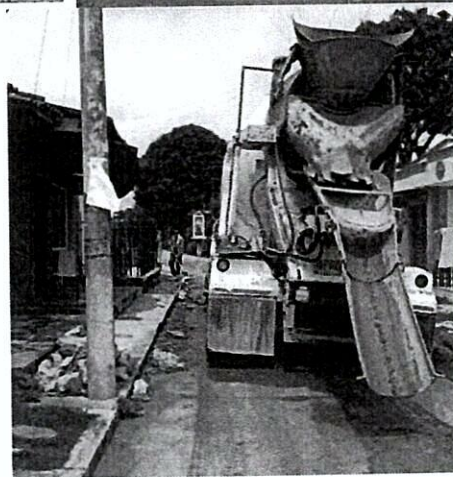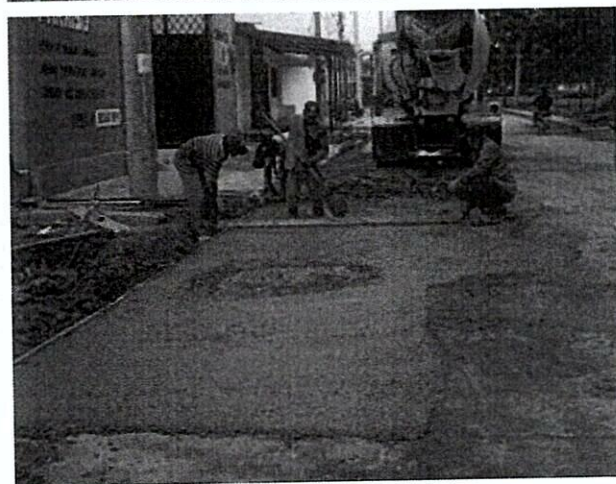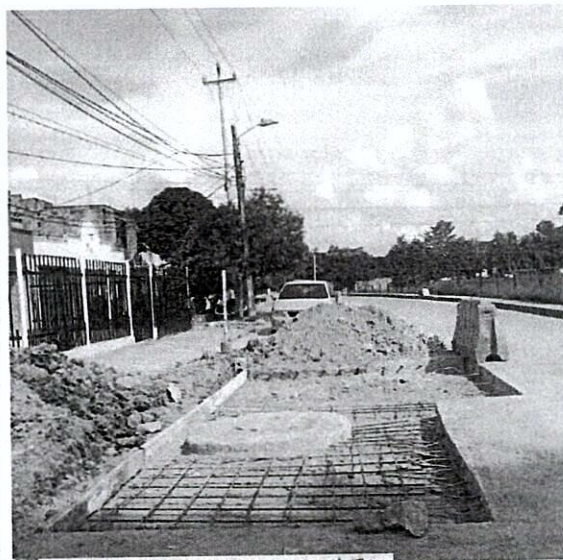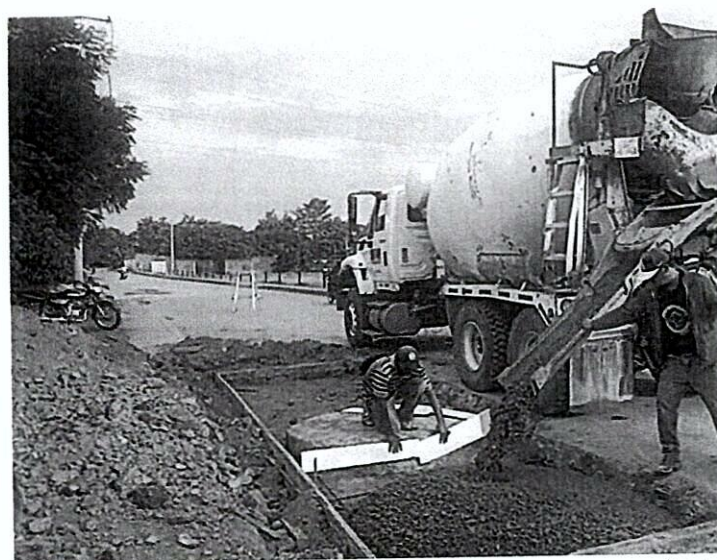

Descripción:

Base para pozo de inspeccion

Fecha:

01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025

Ubicacion:

Sector N°4, Municipio de Cereté




 **Conintercer**
CONSTRUCCIONES INTERCER

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

32

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

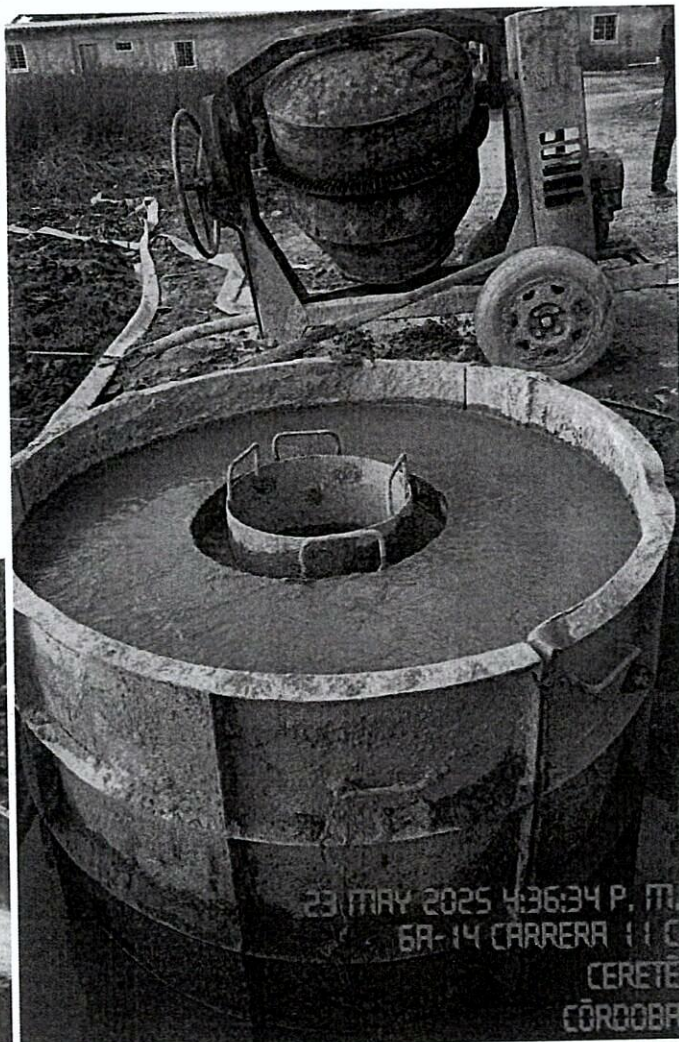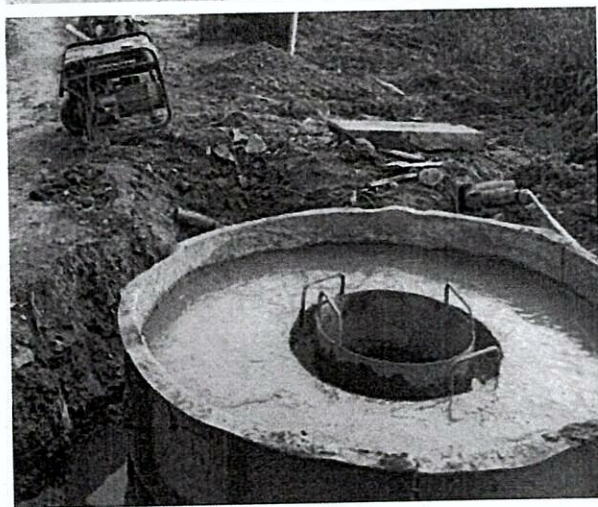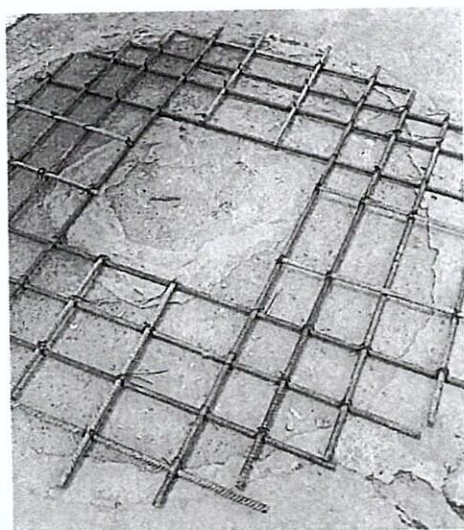




Descripción:	Cilindro pozo en concreto D. Interno = 1,20m e=0,25 - Tapa
Fecha:	01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté

 **Conintercer**
CORPORACIÓN INTERCER

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

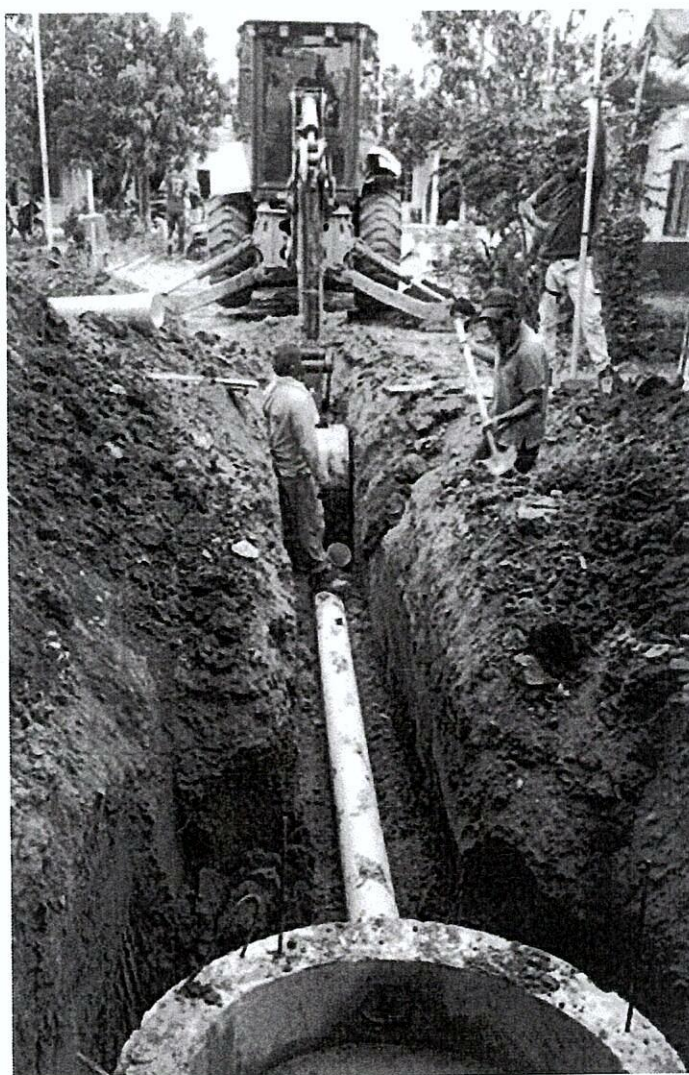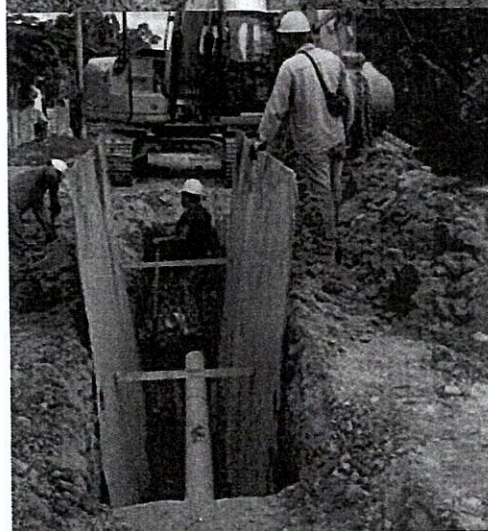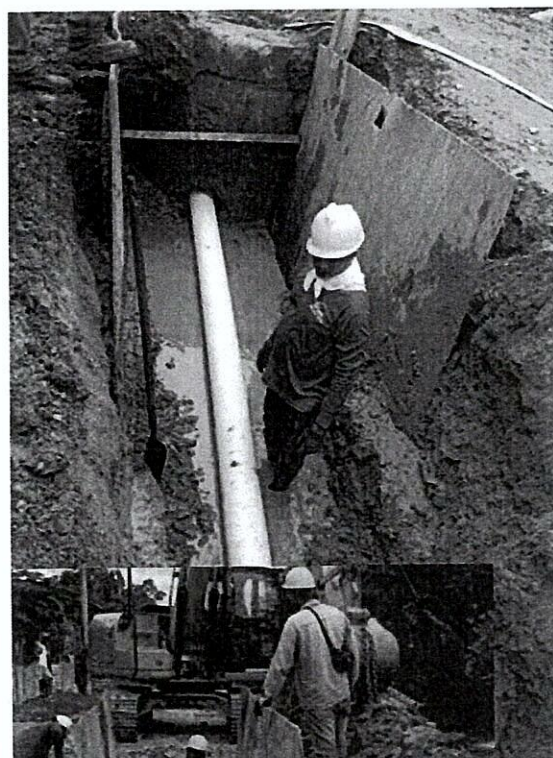

Descripción:	Instalación tubería flexible alcantarillado D 8" (200 mm)
Fecha:	01 de Mayo de 2025 – 27 de Mayo de 2025
Ubicación:	Sector N°4, Municipio de Cereté
	

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

 Conintercer CONSTRUCCIONES	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

135

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																		
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF														
NIT 901551201		6	CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE				B - MENOS DE 299 COTIZANTES				PRINCIPAL				CRA 6 N 65 24 CC PLACE MALL OFIC 319		MONTERIA-CORDOBA		3116607834	No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																		
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																						
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Límite		Pago		Banco				Días Mora		Valor														
2025-05		2025-06		1485699444		9485997946		E		2025/06/04		2025/05/16		BANCOLOMBIA				0		\$4,454,000														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGO									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	tae	tdp	tap	vap	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Código	Días	IBC	Aporta	Código	Días	IBC	Aporta	Código	Días	IBC	Aporta	Código	Días	IBC
1	CC 1068821040	ALCALA JANCARLOS		X															X	231001	15	\$711,750	\$113,900	EP5037	15	\$711,750	\$89,000	CCF16	15	\$788,856	\$31,600	14-11	15	\$711,
2	CC 1071354952	ARRIETA MIGUEL		X															X	230301	15	\$1,100,000	\$178,000	CCFC55	15	\$1,100,000	\$137,500	CCF16	15	\$1,210,000	\$48,400	14-11	15	\$1,100,
3	CC 1067957481	ESPINEL JOHN		X															X	230301	15	\$800,000	\$128,000	EP5041	15	\$800,000	\$100,000	CCF16	15	\$931,111	\$37,300	14-11	15	\$800,
4	CC 78034248	GONZALEZ ALEXANDER		X															X	230301	6	\$284,700	\$45,600	EP5002	6	\$284,700	\$35,600	CCF16	6	\$344,013	\$13,800	14-11	6	\$284,
5	CC 78027432	JAIMES JAIRO		X															X	25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP5041	15	\$711,750	\$89,000	CCF16	15	\$782,925	\$31,400	14-11	15	\$711,
6	CC 1003397656	LYONS YACIRA		X																231001	15	\$750,000	\$120,000	EP5002	15	\$750,000	\$93,800	CCF16	15	\$750,000	\$30,000	14-11	15	\$750,
7	CC 1104422240	MONTERROZA DANIELA		X																230301	15	\$750,000	\$120,000	EP5005	15	\$750,000	\$93,800	CCF16	15	\$750,000	\$30,000	14-11	15	\$750,
8	CC 78030056	MONTES RAFAEL		X																230301	15	\$750,000	\$120,000	EP5037	15	\$750,000	\$93,800	CCF16	15	\$750,000	\$30,000	14-11	15	\$750,
9	CC 1064981749	MUÑOZ ADRIANA		X															X	230201	15	\$1,050,000	\$168,000	E55C07	15	\$1,050,000	\$131,300	CCF16	15	\$1,163,750	\$46,600	14-11	15	\$1,050,
10	CC 73159265	POMARES JAIRO		X															X	231001	15	\$711,750	\$113,900	E55C07	15	\$711,750	\$89,000	CCF16	15	\$782,925	\$31,400	14-11	15	\$711,
11	CC 15645760	RAMIREZ RAFAEL		X															X	230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5037	15	\$711,750	\$89,000	CCF16	15	\$788,856	\$31,600	14-11	15	\$711,
12	CC 1003191338	SANCHEZ ANJAR		X															X	230301	15	\$1,500,000	\$240,000	EP5041	15	\$1,500,000	\$187,500	CCF16	15	\$1,687,500	\$67,500	14-11	15	\$1,500,
Total		Afiliados(12)																				\$9,831,700	\$1,573,200			\$9,831,700	\$1,229,300			\$10,729,936	\$429,600			\$9,831,

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901551201	6	CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 N 65 24 CC PLACE MALL OFIC 319	MONTERIA-CORDOBA	3116607834	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-06	1485699444	9485997946	E	2025/06/04	2025/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$4,454,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$1,573,200	\$0	\$0	\$1,573,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$347,800	\$0	\$0	\$347,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$943,500	\$0	\$0	\$943,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$168,000	\$0	\$0	\$168,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$684,700	\$0	\$0	\$684,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$684,700	\$0	\$0	\$684,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600
EP (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$1,229,300	\$0	\$0	\$1,229,300
COPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$137,500	\$0	\$0	\$137,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$220,300	\$0	\$0	\$220,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$271,800	\$0	\$0	\$271,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$376,500	\$0	\$0	\$376,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$129,400	\$0	\$0	\$129,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$93,800	\$0	\$0	\$93,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$322,300	\$0	\$0	\$322,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	\$322,300	\$0	\$0	\$322,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$214,900	\$0	\$0	\$214,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	\$214,900	\$0	\$0	\$214,900
TOTAL				12	\$4,454,000	\$0	\$0	\$4,454,000

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901553798	1	CONSORCIO INTER 24 CERETE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL22D-16-99 OF 1	MONTERIA-CORDOBA	7901010	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02		9481333115	E	2025/02/24			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLREADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte																	
1	CC 1071357779	ARAUJO MONTES JUAN DAVID	231001	20	\$949,000	\$151,900	EP5041	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0																	
2	CC 1001359084	ARAUJO MONTES MARTIN ELIAS	230301	20	\$949,000	\$151,900	CCFC55	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0																	
3	CC 1007909313	ESCOBAR AGUIAR ANDREA ESTEFANIA	230301	20	\$949,000	\$151,900	EP5002	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$773,334	\$31,000	14-11	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0																	
4	CC 1007944899	LONOUY DE LA OSA MARLEON DAVID	25-14	20	\$949,000	\$151,900	EP5002	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0																	
5	CC 1007866581	MARTINEZ AGUILAR JOHN ANTONIO	230301	20	\$949,000	\$151,900	EP5002	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0																	
6	CC 10782759	PEINADO RUIZ HARVEY ALEJO	230301	20	\$949,000	\$151,900	EP5002	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0																	
7	CC 1003187435	PEREZ GARCIA AURA PATRICIA	230301	20	\$949,000	\$151,900	ESSC07	20	\$949,000	\$38,000	CCF16	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$949,000	\$66,100	20	\$0	\$0																	
Total			Afilados(7)				\$6,643,000				\$266,000				\$5,973,336				\$239,200				\$6,643,000				\$462,700				\$0				\$0			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$1,063,300	\$0	\$0	\$1,063,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$151,900	\$0	\$0	\$151,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$151,900	\$0	\$0	\$151,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$607,600	\$0	\$0	\$607,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$151,900	\$0	\$0	\$151,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$462,700	\$0	\$0	\$462,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$462,700	\$0	\$0	\$462,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$239,200	\$0	\$0	\$239,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$239,200	\$0	\$0	\$239,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$266,000	\$0	\$0	\$266,000
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
NUÉVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
TOTAL				7	\$2,031,200	\$0	\$0	\$2,031,200

 Conintercer CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

PRUEBAS DE ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

MO



RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC-2871

VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS

NIT: 901.384.338-1

Dirección Planta

Kilometro 2 via cerete-san carlos

CODIGO:

LBC-002

VERSION:

1

FECHA:

20/02/2022

PAGINA

1 DE 1

CLIENTE:

CONSORCIO CONSTRUCIONES CERETE

NIT:

90155120146

OBRA:

CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

TIPO DE MEZCLA:

3000 PSI - NORMAL

ASENTAMIENTO EN PLANTA:

Slump 6-4-1"

CONTACTO:

FECHA DE INFORME:

30/05/2025

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA A (kg/cm²)	RESISTENCIA A (Mpa)	RESISTENCIA A (PSI)	% EVOLUCION	PROM. % EVOL	TIPO FALLA
		MH					DIAS	D. (cm)	A. (cm²)							
500	10385	S38-S12	3000	NORMAL	7/01/2025	4/02/2025	28	10,1	80,1	189,20	236,2	23,1	3374	112	110	E
500	10385	S11-S32	3000	NORMAL	7/01/2025	4/02/2025	28	10,1	80,1	182,40	227,7	22,3	3252	108		E
510	10405	A1-A2	3000	NORMAL	8/01/2025	5/02/2025	28	10,0	78,5	171,50	218,4	21,4	3119	104	106	E
510	10405	A3-A10	3000	NORMAL	8/01/2025	5/02/2025	28	10,0	78,5	179,50	228,5	22,4	3265	109		E
540	10455	A8-A9	3000	NORMAL	9/01/2025	6/02/2025	28	10,0	78,5	178,10	228,0	22,3	3258	109		E
540	10455	S31-S40	3000	NORMAL	9/01/2025	6/02/2025	28	10,0	78,5	180,00	229,2	22,5	3274	109	109	E
560	10485	S66-A4	3000	NORMAL	10/01/2025	7/02/2025	28	10,1	80,1	177,45	221,5	21,7	3164	105		E
560	10485	S33-S34	3000	NORMAL	10/01/2025	7/02/2025	28	10,1	80,1	178,30	222,5	21,8	3179	106	106	E
570	10505	S64-S37	3000	NORMAL	11/01/2025	8/02/2025	28	10,0	78,5	187,80	238,9	23,4	3412	114		E
570	10505	S35-S36	3000	NORMAL	11/01/2025	8/02/2025	28	10,0	78,5	185,30	235,9	23,1	3370	112	113	E
585	10555	S28-A5	3000	NORMAL	12/01/2025	9/02/2025	28	10,0	78,5	186,40	237,3	23,3	3390	113		E
585	10555	A6-A7	3000	NORMAL	12/01/2025	9/02/2025	28	10,0	78,5	175,50	223,5	21,9	3192	106	110	E
597	10645	E1-S176C	3000	NORMAL	14/01/2025	11/02/2025	28	10,1	80,1	179,40	223,9	21,9	3199	107		E
597	10645	S176B-A21	3000	NORMAL	14/01/2025	11/02/2025	28	10,1	80,1	183,20	228,7	22,4	3267	109	108	E
607	10675	S13-MH4	3000	NORMAL	17/01/2025	14/02/2025	28	10,0	78,5	176,40	224,6	22,0	3209	107		E
607	10675	A23-A24	3000	NORMAL	17/01/2025	14/02/2025	28	10,0	78,5	179,30	228,3	22,4	3261	109	108	E
627	10695	A22-A25	3000	NORMAL	18/01/2025	15/02/2025	28	10,0	78,5	177,00	225,4	22,1	3219	107		E
627	10695	A26-S125A	3000	NORMAL	18/01/2025	15/02/2025	28	10,0	78,5	185,30	235,9	23,1	3370	112	110	E
647	10715	S114-S516A	3000	NORMAL	20/01/2025	17/02/2025	28	10,0	78,5	188,30	239,8	23,5	3425	114		E
647	10715	E2-IVCD9	3000	NORMAL	20/01/2025	17/02/2025	28	10,0	78,5	180,20	229,4	22,5	3278	109	112	E
667	10735	IVCD10-IVCD11	3000	NORMAL	10/02/2025	10/03/2025	28	10,0	78,5	183,80	234,0	22,9	3343	111		E
667	10735	IVCD12-S143	3000	NORMAL	10/02/2025	10/03/2025	28	10,0	78,5	179,80	228,9	22,4	3270	109	110	E
687	10755	2	3000	NORMAL	20/05/2025	23/05/2025	3	10,0	78,5	135,20	172,1	16,9	2459	82		E
687	10755	3	3000	NORMAL	20/05/2025	23/05/2025	3	10,0	78,5	136,30	173,5	17,0	2479	83	82	E
707	10775	S516	3000	NORMAL	22/05/2025	25/05/2025	3	10,0	78,5	136,20	173,4	17,0	2477	83		E
707	10775	S515	3000	NORMAL	22/05/2025	25/05/2025	3	10,0	78,5	137,90	175,6	17,2	2508	84	83	E
710	10795	S78	3000	NORMAL	23/05/2025	26/05/2025	3	10,0	78,5	137,20	174,7	17,1	2486	83		E
710	10795	S58	3000	NORMAL	23/05/2025	26/05/2025	3	10,0	78,5	138,50	176,3	17,3	2519	84	84	E
740	10815	S505	3000	NORMAL	24/05/2025	27/05/2025	3	10,0	78,5	139,20	177,2	17,4	2532	84		E
740	10815	S45	3000	NORMAL	24/05/2025	27/05/2025	3	10,0	78,5	140,20	178,5	17,5	2550	85	85	E
770	10835	S44	3000	NORMAL	26/05/2025	29/05/2025	3	10,0	78,5	134,50	171,3	16,8	2446	82		E
770	10835	S122	3000	NORMAL	26/05/2025	29/05/2025	3	10,0	78,5	133,50	170,0	16,7	2428	81	81	E

Observaciones :

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DIRECTORA



RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC-2071
VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS
NIT: 901.384.338-1
Dirección Planta
Kilometro 2 via cerete-san carlos

CODIGO:	LBC-002
VERSION:	1
FECHA:	20/02/2022
PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
NIT: 90155120146
OBRA: CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR N°4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
TIPO DE MEZCLA: 3000 PSI - NORMAL
ASENTAMIENTO EN PLANTA: Slump 6-4-1"
CONTACTO:
FECHA DE INFORME: 30/05/2025

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO	D. (cm)	A. (cm²)	CARGA (Kgf)	RESISTENCIA A (kg/cm²)	RESISTENCIA A (Mpa)	RESISTENCIA A (PSI)	% EVOLUCION	PROM. % EVOL.	TIPO FALLA
101	10385	515-5134-5135-5136-5148	3000	NORMAL	14/04/2023	12/05/2023	28	10.1	80.1	175.00	219.7	21.5	3138	105		E
101	10385	5107-5107A-5137-5156-5149	3000	NORMAL	14/04/2023	12/05/2023	28	10.1	80.1	177.00	220.9	21.7	3156	105	105	E
110	10405	598-5106-5105-5155-5146	3000	NORMAL	27/04/2023	25/05/2023	28	10.0	78.5	175.50	223.5	21.9	3192	106		E
110	10405	5104-5103-5102-597-5147	3000	NORMAL	27/04/2023	25/05/2023	28	10.0	78.5	175.50	223.5	21.9	3192	106	106	E
130	10455	587-588-589-595-586	3000	NORMAL	29/04/2023	27/05/2023	28	10.0	78.5	183.30	233.4	22.9	3334	111		E
130	10455	596-5152A-5162-514-592	3000	NORMAL	29/04/2023	27/05/2023	28	10.0	78.5	182.00	231.7	22.7	3310	110	111	E
145	10485	5144-5145-557-563-591	3000	NORMAL	25/05/2023	22/06/2023	28	10.1	80.1	191.10	238.5	23.4	3407	114		E
145	10485	FS-FA-F3-561-F6-F8	3000	NORMAL	25/05/2023	22/06/2023	28	10.1	80.1	190.34	237.6	23.3	3394	113	113	E
147	10495	F3-F2-F1-IVCD1-590	3001	NORMAL	27/05/2023	24/06/2023	28	10.1	80.1	181.80	227.0	22.2	3243	108		E
147	10495	S4-S5-S6-S7-583-IVCD21	3001	NORMAL	27/05/2023	24/06/2023	28	10.1	80.1	179.50	224.0	22.0	3201	107	107	E
149	10500	529-530-542-IVCD2-IVCD2	3002	NORMAL	29/05/2023	26/06/2023	28	10.1	80.1	180.10	224.8	22.0	3211	107		E
149	10500	F14-F15-F13-IVCD3-5150	3002	NORMAL	29/05/2023	26/06/2023	28	10.1	80.1	183.70	229.3	22.5	3276	109	108	E
150	10505	S151-S152	3000	NORMAL	1/08/2023	29/08/2023	28	10.0	78.5	183.30	233.4	22.9	3334	111		E
150	10505	S50-S77-S84	3000	NORMAL	1/08/2023	29/08/2023	28	10.0	78.5	191.10	243.3	23.8	3476	116	114	E
155	10515	MH1-S69	3000	NORMAL	31/08/2023	28/09/2023	28	10.0	78.5	187.30	236.5	23.4	3407	114		E
155	10515	S16-S17	3000	NORMAL	31/08/2023	28/09/2023	28	10.0	78.5	188.50	240.0	23.5	3429	114	114	E
301	10555	S87	3000	NORMAL	27/05/2024	24/06/2024	28	10.0	78.5	177.00	225.4	22.1	3219	107		E
301	10555	S70	3000	NORMAL	27/05/2024	24/06/2024	28	10.0	78.5	175.50	223.5	21.9	3192	106	107	E
320	10645	S71-S72	3000	NORMAL	2/08/2024	30/08/2024	28	10.1	80.1	183.20	228.7	22.4	3267	109		E
320	10645	S43-S110	3000	NORMAL	2/08/2024	30/08/2024	28	10.1	80.1	182.10	227.3	22.3	3247	108	109	E
345	10675	S52-S51-S47	3000	NORMAL	12/09/2024	10/10/2024	28	10.0	78.5	175.50	223.5	21.9	3192	106		E
345	10675	S46-IVCD4	3000	NORMAL	12/09/2024	10/10/2024	28	10.0	78.5	182.00	231.7	22.7	3310	110	108	E
346	10676	S54-S48-S49-S55	3000	NORMAL	14/09/2024	12/10/2024	28	10.0	78.5	188.50	240.0	23.5	3429	114		E
346	10677	A12-A19-A20-A18	3000	NORMAL	14/09/2024	12/10/2024	28	10.0	78.5	190.30	242.3	23.7	3461	115	115	E
347	10678	A13-A14-A15-MHP1	3000	NORMAL	16/09/2024	14/10/2024	28	10.0	78.5	180.20	229.4	22.5	3278	109		E
347	10679	S172-S48-S512	3000	NORMAL	16/09/2024	14/10/2024	28	10.0	78.5	179.50	228.5	22.4	3265	109	109	E
348	10680	S513-S514-S507-S508	3000	NORMAL	22/10/2024	19/11/2024	28	10.0	78.5	178.90	227.8	22.3	3254	108		E
348	10681	S509-S510-S81-S74	3000	NORMAL	22/10/2024	19/11/2024	28	10.0	78.5	180.70	230.1	22.5	3287	110	109	E
349	10682	S75-S80-S79-S82	3000	NORMAL	23/10/2024	20/11/2024	28	10.0	78.5	185.30	235.9	23.1	3370	112		E
349	10683	S76	3000	NORMAL	23/10/2024	20/11/2024	28	10.0	78.5	190.80	243.1	23.8	3472	116	114	E
350	10684	MHP5-S138-S139-S139A	3000	NORMAL	24/10/2024	21/11/2024	28	10.0	78.5	192.30	244.8	24.0	3498	117		E
350	10684	S167A-S18-S154-S154	3000	NORMAL	24/10/2024	21/11/2024	28	10.0	78.5	190.20	242.2	23.7	3460	115	116	E
358	10690	S153-S24-S8-S7	3000	NORMAL	9/12/2024	6/01/2025	28	10.0	78.5	178.70	227.5	22.3	3250	108		E
358	10690	S26-S9-S27-S38	3000	NORMAL	9/12/2024	6/01/2025	28	10.0	78.5	181.50	231.1	22.8	3301	110	109	E
360	10695	S105-S83	3000	NORMAL	18/12/2024	15/01/2025	28	10.0	78.5	177.00	225.4	22.1	3219	107		E
360	10695	S100-S10	3000	NORMAL	18/12/2024	15/01/2025	28	10.0	78.5	182.50	232.4	22.8	3320	111	109	E

Observaciones:

PEDRO GONZALEZ
ELABORÓ
LABORATORISTA

TANIA BANDA GARCES
APROBÓ
INGENIERA DIRECTORA

 Conintercer CONSTRUCCIONES	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SUSPENSIONES, REINICIOS, OTROSÍES

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

143

ACTA DE SUSPENSION N°4**AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. AQLATAM-ALC-002-2022**

CONTRATISTA	CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRECE (13) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. (\$738.545.608,13)

En el Municipio de Cereté, EL diecisiete (17) de enero de 2025, se reunieron en las oficinas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. **ANA MARÍA VELLOJIN**, como supervisión técnica designada por AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., empresa contratante y el Señor **JHON ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR**, como representante legal del CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ en calidad de contratista, con el propósito de suspender las actividades derivadas del objeto en referencia debido a las siguientes consideraciones:

1. El 22 de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, el MUNICIPIO DE CERETÉ- CORDOBA y AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P., para le ejecución del proyecto que tiene como objeto "Construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N°4 etapa II en el Municipio de Cerete, departamento de córdoba"
2. Que el contrato de interventoría No AQLATAM.ALC-002-2022 que tiene como objeto la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". se firmó el 11 de enero de 2022
3. Que el acta de inicio del contrato de interventoría No AQLATAM-ALC-002-2022 se firmó el 31 de enero de 2022.
4. Que el 16 de julio del año 2022 se suspendió el contrato de obras por motivo de reformulación del proyecto.
5. Que el 30 de noviembre del año 2022 se reinició el contrato de interventoría No. AQLATAM-ALC-002-2022 una vez aprobada la reformulación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

6. Que el 04 de enero de 2023 se llevó a cabo la designación de la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.
7. Que, al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidencia que algunas de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coinciden con las verificadas en campo, se suspendió el contrato el 23 de enero de 2023 hasta el 15 de febrero de 2023.
8. Que en la zona de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto en cuestión, históricamente ha sido un sector cenagoso de predios bajos, y más por la época invernal donde se han venido presentando protestas de las comunidades debido a las inundaciones presentadas en el sector, afectando el rendimiento de las obras debido a los bloqueos presentados, adicionalmente, el exceso de lluvias no permite en este momento la ejecución de las obras según la programación actual
9. Que en fecha de 17 de noviembre de 2023 se celebró la suspensión No. 3 del contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ por motivos de trámite de reformulación II ante el MVCT.
10. Que en comité No. 2024-7 de 5/04/2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó la solicitud de Reformulación II del Proyecto.
11. Que el 20 de mayo de 2024 se reinició el contrato de interventoría No. AQLATAM-ALC-002-2022 una vez aprobada la reformulación II del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
12. Que el día 14 de noviembre de 2024 mediante oficio OFIC-ALC-CC-061 el contratista CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ presentó solicitud de prorroga al contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022, el cual avaló la interventoría mediante oficio luego de revisión y evaluación de este.
13. Que el día 19 de diciembre de 2024 por requerimiento de la supervisión y en virtud de que actualmente el proyecto se encuentra en reformulación III ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, debido a diversas situaciones imprevistas presentadas en campo, se amplía el plazo de ejecución del contrato en un (1) mes más.
14. Que mediante radicado No. 2025ER0003152, se presentó solicitud de ampliación del plazo del convenio CUR 1072-2021 por un tiempo de seis (6) meses, debidamente motivada y radicada con los soportes de las entidades convenientes.
15. Que a la fecha el Convenio interadministrativo de Uso de Recursos N° 1072 de 2021 suscrito entre AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP, Municipio De Cereté y Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio no ha sido prorrogado, por lo tanto, no se puede prorrogar los contratos derivados.
16. Que Aqualia Latinoamérica S.A E.S.P no cuenta dentro de su convenio con el tiempo avalado, aprobado y que necesita el contrato No. AQLATAM-ALC-001-2022 para cumplir con el objeto contractual.
17. Que una vez se prorroguen el convenio interadministrativo de Uso de Recursos N° 1072
18. de 2021 suscrito entre AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP, Municipio De Cereté y Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio se dará reinicio a los contratos derivados con el fin de no agotar los tiempos establecidos.



19. Para mayor constancia, se firma a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2025.

Por lo anterior, las partes involucradas, contratante y contratista, deciden suspender el contrato de obra No. AQLATAM-ALC-002-2022, a partir del 17 de enero del año 2025.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron.

ANA MARIA VELLOJIN
Supervisora designada
AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
CONTRATANTE

JHON MARTINEZ AGUILAR
R.L. CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
INTERVENTORÍA

ACTA DE REINICIO N°4

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO: AQLATAM-ALC-002-2022
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR: \$738.545.608,13
CONTRATANTE: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
SUPERVISOR: MARÍA ALEJANDRA OLIVAR CORONADO
FECHA DE INICIO : 31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 : 16 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2 : 23 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 3 : 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN 4 : 17 DE ENERO DE 2025
PLAZO: EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
OTROSÍ No. 2 : ADICIÓN 137 DÍAS
OTROSÍ No. 3 : ADICIÓN 30 DÍAS
FECHA TERMINACION INICIAL: 28 DE FEBRERO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los treinta un (31) días del mes de marzo del año 2025, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **ANA MARIA VELLOJIN ARGEL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.008.617 expedida en Cereté, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **JOHN ANTONIO MARTINEZ AGUILAR**, identificado con C.C. No. 1.067.866.581 de Montería, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato AQLATAM-ALC-002-2022, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que en fecha de 17 de enero de 2025 se celebró la suspensión No. 4 del contrato de obra AQLATAM-ALC-002-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ.

2. Que, el 22 de enero de 2025 se suscribió la prorroga del convenio marco 1072 de 2021, donde se amplió el plazo de ejecución.
3. Que, mediante oficio con radicado 2025EE0012795 el MVCT aprobó la reformulación III presentada para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II" debido a situaciones encontradas en sitio.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de interventoría AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEGUNDO: El contratista de obra se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 31 de marzo del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a supervisar y vigilar todas las actividades a realizar por el contratista contempladas en la reformulación III del proyecto acorde al balance entregado de menores y mayores cantidades, precios unitarios e ítems no previstos.

CUARTO: El contratista de interventoría se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,


ANA MARÍA VELLOJIN ARGEL
Supervisora
AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P


JOHN ANTONIO MARTÍNEZ
AGUILAR
Representante legal
CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ
Contratista de interventoría

OTROSÍ No. 04 AL CONTRATO AQLATAM-ALC-002-2022

Entre los suscritos a saber: (i) **FRANCISCO JIMENEZ MEDINA** identificado con cédula de extranjería No. 8.010.793 en calidad de representante legal suplente de la sociedad **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.**, persona jurídica legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 39 del quince (15) de enero de 2020 en la Notaria 10 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el veintidós (22) de enero de 2020 con el No. 02544602 del Libro IX del registro mercantil e identificada con el NIT. 901.362.452-7 quien en adelante se denominará "**AQUALIA**"; y por la otra parte, (ii) **JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.067.866.581 de Montería, obrando en calidad de representante legal de **CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ** identificado con NIT 901.553.798-1, en lo sucesivo "**EL CONTRATISTA**", (en conjunto con AQUALIA "Partes") acordamos celebrar el presente OTROSÍ No. 03, al CONTRATO AQLATAM-ALC-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO 4 ETAPA II MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, que se registrá por las normas del derecho privado, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el veintidós (22) de octubre de 2021, se suscribió convenio 1072 de 2021, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE CERETÉ-CÓRDOBA Y AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., para la ejecución del proyecto que tiene como objeto la "construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector N° 4 etapa II municipio de Cereté, departamento de Córdoba".
2. Que, el contrato de interventoría No AQLATAM ALC-002-2022 que tiene como objeto la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO 4 ETAPA II MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", se firmó el once (11) de enero de 2022.
3. conforme a la **CLÁUSULA 4** del contrato el plazo de ejecución se pactó por trece (13) meses contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el treinta y uno (31) de

enero de 2022, teniendo como fecha prevista de finalización el veinticinco (25) de febrero de 2023

4. Que, el dieciséis (16) de julio del año 2022 se suspendió el contrato de obra por motivo de reformulación del proyecto.

5. Que, el treinta (30) de noviembre del año 2022 se reinició el contrato de interventoría No AQLATAM-ALC-002-2022 una vez aprobada la reformulación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

6. Que el cuatro (04) de enero de 2023 se llevó a cabo la designación de la nueva supervisión técnica del convenio 1072 de 2021 por parte de Aqualia Latinoamérica S.A E.S.P., y al llevar a cabo revisión en campo por parte de la nueva supervisión técnica del convenio, se evidencia que algunas de las cotas aprobadas en la reformulación del proyecto no coinciden con las verificadas en campo.

7. Que, al presentar la inconsistencia descrita en el numeral anterior, se considera necesario suspender el contrato de interventoría No AQLATAM-ALC-002-2022 con el fin de realizar una revisión general de la topografía en la zona de intervención del proyecto por un plazo de treinta (30) días, desde el veintitrés (23) de enero de 2023.

8. Que el contratista de interventoría reinicio actividades el quince (15) de febrero de 2023, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

9. Que, teniendo en cuenta que en la zona de ejecución del proyecto se presenta el incremento de fuertes lluvias y el aumento del nivel freático en las excavaciones, lo cual dificulta las excavaciones, el contratista ha presentado retrasos representativos en la ejecución de las obras contratadas, por lo anterior, el contratista solicitó mediante oficio dirigido a interventoría una adición en tiempo para terminar el contrato en seis (6) meses.

10. Que la interventoría avaló la solicitud realizada por el contratista mediante oficio OFI-INT-CER-030 del cinco (5) de junio de 2023 y adicionalmente el contratista manifiesta no aumentar el valor el contrato, sino distribuir los recursos en los meses restantes para el tiempo adicionado bajo las mismas condiciones de control y seguimiento contractuales.

11. Que, no existiendo impedimento legal, y contándose con el aval de la interventoría el tres (3) de agosto de 2023, se suscribe Otrosí No. 1 mediante el cual las partes acuerdan
i) Prorrogar el plazo del contrato en seis (6) meses más, por lo tanto, el nuevo plazo

previsto de terminación es el treinta y uno (31) de enero de 2024, ii) Distribuir los recursos restantes del contrato en el tiempo adicionado, sin que esto implique costo adicional al contrato, así como se detalla a continuación:

PERIODO CORTE 1 (03 DE SEPTIEMBRE DE 2023):	\$ 22.724.480,38
PERIODO CORTE 2 (06 DE OCTUBRE DE 2023):	\$ 22.724.480,38
PERIODO CORTE 3 (06 DE NOVIEMBRE DE 2023):	\$ 22.724.480,38
PERIODO CORTE 4 (06 DE DICIEMBRE DE 2023):	\$ 22.724.480,38
PERIODO CORTE 5 (06 DE ENERO DE 2024):	\$ 22.724.480,38
PERIODO CORTE 6 (06 DE FEBRERO DE 2024):	\$ 22.724.480,38

12. Que, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite ante la ANI los permisos de las vías a intervenir necesarios para el trámite de reformulación II ante el MVCT, y que en la zona de ejecución se presentaron incremento de lluvias y aumento del nivel freático en las excavaciones, se generaron retrasos representativos en la ejecución de la obra, por lo anterior se hace necesario firmar suspensión No. 3 al contrato a partir del diecisiete (17) de noviembre de 2023, una vez superada las causales de suspensión el contrato se reinició el veinte (20) de mayo de 2024, por lo tanto la nueva fecha de finalización es el tres (3) de agosto de 2024.

13. Que el cuatro (4) de agosto de 2024 se suscribió otrosí No. 2 al contrato, mediante el cual las partes acuerdan prorrogar el plazo del contrato en cuatro (4) meses y diecisiete (17) días, por lo tanto, el nuevo plazo previsto de terminación es el diecinueve (19) de diciembre de 2024.

14. Que el veintiuno (21) de mayo de 2024 se suscribió otrosí No. 03 al convenio No. 1072 de 2021, en virtud del cual se amplió el plazo de ejecución por ocho (8) meses adicionales, hasta el 21 de enero de 2025.

15. Que, atendiendo el requerimiento del área técnica y teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en reformulación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, debido a diversas situaciones imprevistas presentadas en campo, el diecinueve (19) de diciembre de 2024 se suscribió otrosí No 3 al contrato mediante el cual las partes acordaron ampliar el plazo de ejecución en un (1) mes por lo cual la nueva fecha prevista de finalización es el diecinueve (19) de enero de 2025

16. Que el tres (03) de diciembre de 2024 mediante radicado No 2024ER0193789 se solicitó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la reformulación III del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN

DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" debido a situaciones encontradas en sitio y variaciones en el alcance de este.

17. Que el diecinueve(19) de diciembre de 2024 se suscribió el otrosí No. 3, en virtud del cual se amplió el plazo de ejecución por un (01) mes adicional, hasta el 18 de enero de 2025.

18. Que mediante radicado No.2025ER0003152, se presentó solicitud de ampliación del plazo del convenio CUR 1072-2021 por un tiempo de seis (6) meses, debidamente motivada y radicada con los soportes de las entidades convenientes.

19. Que a la fecha el Convenio interadministrativo de Uso de Recursos N° 1072 de 2021 suscrito entre AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP, Municipio De Cereté y Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio fue prorrogado hasta el 21 de julio de 2025, de acuerdo con el Otrosí No. 04 suscrito entre las partes y el ejecutor el 21 de enero de 2025, por lo tanto, los contratos derivados pueden ser prorrogados hasta la fecha.

20. Que el día dieciocho (18) de marzo de 2025, desde la Subdirección de Proyectos del MVCT se notificó al municipio de Cereté y al ejecutor AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P la aprobación de la reformulación III del proyecto, donde se solicitó al ejecutor adelantar los trámites correspondientes para continuar las actividades del proyecto viabilizadas en la reciente reformulación III.

21. Que, habiéndose aprobado la Reformulación III del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y con el fin de culminar las actividades del proyecto, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra en dos (2) meses más.

Por lo anterior las partes contratantes;

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA 4. "PLAZO DE EJECUCIÓN"** del contrato No. AQLATAM-ALC-002-2022, únicamente en el sentido de ampliar su termino de ejecución en dos (2) meses, finalizando el siete (7) de junio de 2025.

De lo anterior que la vigencia global del contrato sea la comprendida entre el treinta y uno (31) de enero de 2022 y el siete (7) de junio de 2025.




AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.
Contrato AQLATAM-ALC -002-2022

CLÁUSULA SEGUNDA: Garantías y seguros. El CONTRATISTA deberá ampliar a su costo y a favor de AQUALIA, las garantías del contrato que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, y presentar a los cinco (5) días siguientes de la suscripción del Otrosí.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas contractuales continúan vigentes y sin ninguna modificación.

Para constancia, se firma a los siete (7) días del mes de abril de 2025.

AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.	EL CONTRATISTA
Nombre: FRANCISCO JIMÉNEZ MEDINA	Nombre: JHON ANTONIO MARTINEZ AGUILAR
Firma: 	Firma: 
Nombre: JORGE BURGOS PALACIOS Apoderado	
Jorge E. Burgos Firmado digitalmente por Jorge E. Burgos Fecha: 2025.04.25 12:45:06 -05'00'	
Firma:	

V/bno: Oscar Gómez Duque
Jefe unidad de Gestión


Firmado digitalmente
por ARANDA
MARTINEZ JORGE -
13151224P
Fecha: 2025.04.22
17:53:06 -05'00'

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

154

INFORME COMPOSICION

*CONTINUA
CION DE
CIRIO DE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUREDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

Tabla de contenido

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO.....	2
1. COMPONENTE CALIDAD.	2
1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.	2
1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.....	3
2 COMPONENTE AMBIENTAL.	3
2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales	4
2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos	4
2.3 Reporte de Contingencias Ambientales.....	4
3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5
3.1 Personal en obra.....	5
3.1 Afiliación y Pago de seguridad social.....	6
3.2 Reporte accidentes.....	6
3.3 Inspecciones de obra	6
3.4 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.	6
3.5 Reporte Sobre Instalaciones	7
3.6 Reporte de Capacitaciones SST	8
3.7 Notificación de riesgos	8
4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS.....	9

152

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUYEDS CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

INFORME DEL CONTRATISTA COMPONENTE PGIO

1. COMPONENTE CALIDAD.

1.1. Inspección y Reporte de Equipos y/o Herramientas para la Realización de Ensayos en Obra.

Durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025 se utilizaron los siguientes equipos para verificación de Calidad:

Tabla 1 Equipos Para Verificación de Calidad en Obra

Nº	Tipo
1	Tubo 6" 8" 10" 12"
2	Hidrosellos 6" 8" 10" 12"
3	yee
4	Silla yee
5	Unión
6	Tubo PVC
7	Unión de reparación
8	Collarín
9	codo
10	Tapón
11	Tubo sanitario
12	Unión hembra PVC
13	Unión macho PVC
14	Varillas para manjoles
15	Alambre negro
16	Unión sanitaria 2" 3" 4"
17	Moto bomba sumergible
18	Nivel Sokkia – N12-24

VER ANEXO C -1

VER ANEXO C -2

15

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUREDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

1.2 Verificación de Certificado de Calidad de Materiales y Legalidad de Sitios de Extracción de Materiales.

A continuación, se relacionan los materiales e insumos utilizados en obra para el presente periodo:

Tabla Calidad de Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	1743.61 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1890.84 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	232.52 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	255.66 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	286.66 M3	CENTRACOR	SI

VER ANEXO C - 6

1.2. Reporte de Ensayos de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Calidad

Durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025 se realizaron los siguientes ensayos:

Tabla Calidad de ensayos

Nº	Tipo de Ensayo	Fecha de Toma Muestra
1	Resistencia a la compresión de viguetas en concreto.	N/A
2	Resistencia a la compresión de viguetas en concreto.	N/A

2 COMPONENTE AMBIENTAL.

A continuación, se presenta el manejo relacionado con el Componente Ambiental del Contrato de obra **AQLATAM-ALC-001-2021** durante el transcurso del periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUREDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

2.1 Verificación y Seguimiento de sitios de obtención de materiales

En la siguiente tabla se describen los materiales utilizados en el desarrollo de la obra:

Tabla Materiales

Nº	MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	CERTIFICADO
1	Material proveniente de excavación	1743.61 M3	OBRA	NO
2	Recebo común	1890.84 M3	CENTRACOR	SI
3	Triturado 1"	232.52 M3	CENTRACOR	SI
4	Grava	255.66 M3	CENTRACOR	SI
5	Piedra rajón	286.66 M3	CENTRACOR	SI

- Los certificados se encuentran en la carpeta de anexos calidad.

2.2 Reporte de los documentos de vehículos, maquinaria y/o equipos

En la siguiente tabla se relacionan los vehículos, maquinaria y/o equipos utilizados durante las actividades.

Tabla Relación de Vehículos, maquinaria y equipos

Vehículo maquinaria o equipo	Identificación	Tarjeta de propiedad
MC 01	MC047876	Si

VER ANEXO A - 1

2.3 Reporte de Contingencias Ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025, no se presentaron contingencias de tipo Ambiental o Durante el desarrollo de las actividades se presentó una emergencia de tipo Ambiental.

186

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUREDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

Fecha	Capacitación	Duración de las capacitaciones
03/04/2025	Calentamiento global	30 Min
06/05/2025	Mitigación del cambio climatico	30 Min

ANEXO - CAPACITACIONES

3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo de 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025.

3.1 Personal en obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal profesional y operativo participante en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025.

PLIEGO PROFESIONAL CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.551.201-6		 CONSTRUREDES CERETE
78.038.056	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	DIRECTOR DE LA OBRA
50.896.562	DANIELA MONTERROZA PERCY	TRABAJADORA SOCIAL
1.068.812.040	JAN CARLOS ALCALA FLOREZ	OFICIOS VARIOS
73159265	JAIR POMARES	TOPOGRAFO
1003397656	YACIRA LYONS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1003191338	ANUAR SANCHEZ	INGENIERO RESIDENTE

Tabla 1: Relación personal profesional.

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S NIT: 900.584.006-4		 SOLUCIONES DE INGENIERIA
1067281831	LUIS FERNANDO PAEZ	OPERADOR DE MINICARGADOR

Tabla 2: Personal operativa maquinaria subcontratada

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUREDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

3.1 Afiliación y Pago de seguridad social

Se verificó la vinculación de los trabajadores directos del **CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE**, y los subcontratistas, **SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S**

VER ANEXO SST – 1.1 SS CONSTRUREDES

VER ANEXO SST – 1.2 SS NOMADAS

3.2 Reporte accidentes.

Durante este periodo se presentaron **0** accidentes y/o incidentes laborales o de transito como lo refleja cuadro resumen, que se muestra a continuación

Tabla Reporte de accidentes

Descripción	Periodo	Cantidad
No. Accidentes Laborales	MARZO – MAYO	0
No Accidentes de Transito	MARZO – MAYO	0
Días de Incapacidad por Accidentes Laborales	MARZO – MAYO	0

3.3 Inspecciones de obra

En este periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025, se realizaron Inspección de orden y aseo, inspección de uso seguro de herramientas, inspección de dotación y epp.


ANEXO SST INSPECCIONES

3.4 Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.

En la obra se encuentra botiquín, camilla y extintor.


Anexar registro fotográfico.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUREDES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

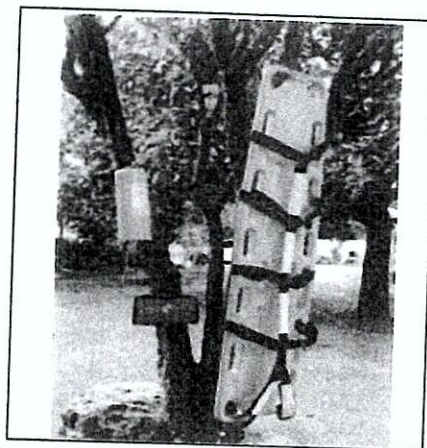


3.5 Reporte Sobre Instalaciones

Se cuenta con una oficina administrativa dotada, cuenta con los servicios de Agua, Luz, Internet, archivo, comunicación telefónica y sanitaria para Hombres y Mujeres.

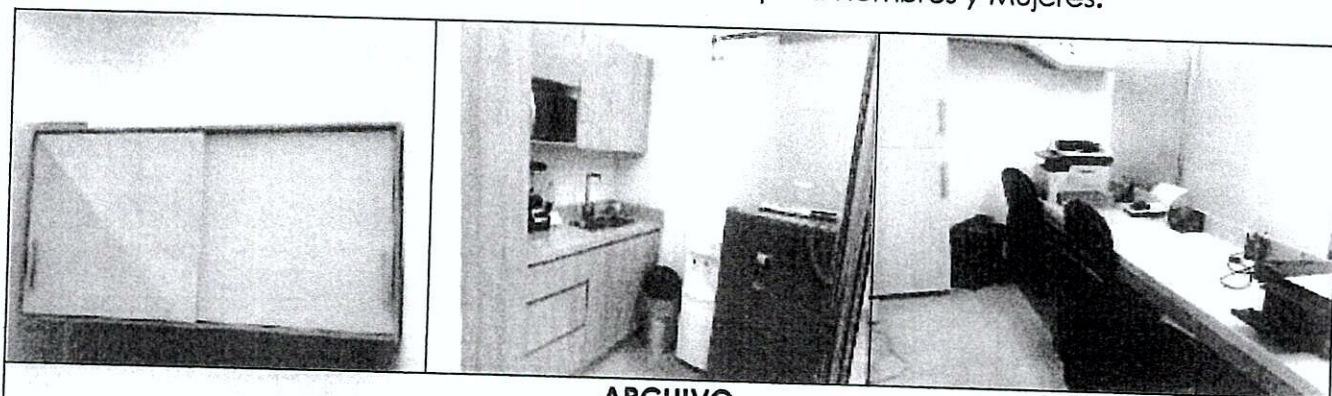

ARCHIVO



BAÑOS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
 CONSTRUYERES CERETE	INFORME MENSUAL PGIO CONTRATISTA	CODIGO: SIG-PLA001
		Versión: 001

3.6 Reporte de Capacitaciones SST

A continuación, se muestra tabla con resumen de capacitaciones efectuadas en el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025.

Tabla Reporte de capacitaciones SST

Fecha	Capacitación	Duración de la capacitación
22/04/2025	PRIMEROS AUXILIOS BASICOS	30 Min
13/05/2025	CUIDADO DE LA VISION	30 Min
21/05/2025	USO CORRECTO DE EPP	30 Min

ANEXO SST CAPACITACIONES

3.7 Notificación de riesgos

En este comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025, se realizó la notificación de riesgos "excavación para instalación de tubería".

ANEXO SST NOTIFICACION

3.8 INSPECCION PREOPERACIONAL

En este comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025, se realizó la inspección pre operacional de maquinaria.

ANEXO SST PREOPERACIONAL



3.9 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SST DE CONTRATISTA

En este comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y 26 de mayo de 2025, se realizó la evaluación de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo.




ANEXO SST EVALUACION DE CUMPLIMIENTO



4.0 ANEXOS FOTOGRAFICOS

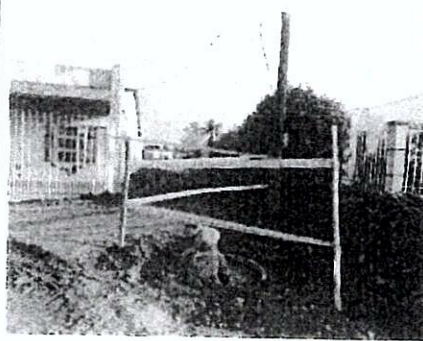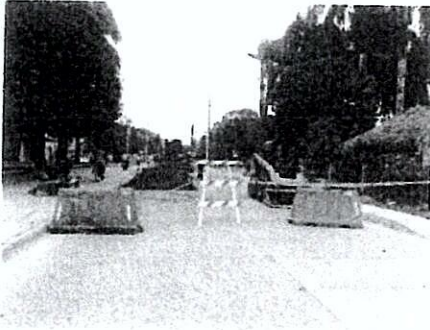

CIERRE DE LA VIA

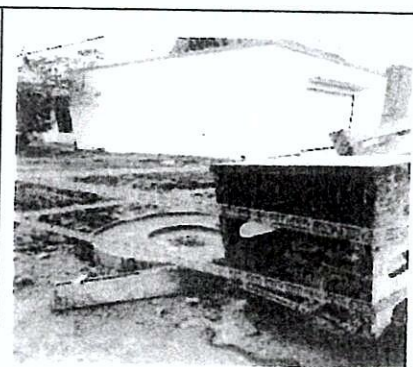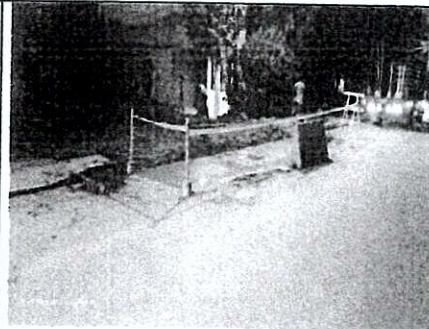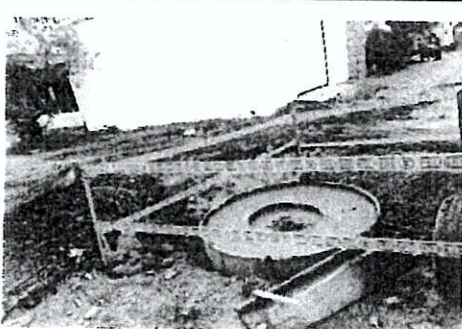

CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD

[Handwritten signature]

CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

 Conintercer CONSTRUCCION PUBLICA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de córdoba

CERTIFICACION DE EQUIPOS

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

		Informe Final
Version 1	Código AQLATAM-ALC-002-2022	

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

		F - CERTIFICADO DE AJUSTE
Código: 0-F-04 Versión: 04 Edición: 02/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 1		

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C4258

INSTRUMENTO:	Nivel	FECHA DE REVISIÓN:	20 DE MARZO DE 2024
MARCA:	TOPCON	SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2024
REFERENCIA:	AT-B4	CLIENTE:	CONSTRUCTORA TERLUZ
SERIAL:	WP139454	CUIDAD:	CERETE, Córdoba
		CELULAR:	3136461406

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE
NIVELES TABULARES Y ESFERICOS
HORIZONTALIDAD
OPTICA GENERAL
MOVIMIENTOS TANGENCIALES

INSPECCIÓN DE CONTROL DE COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO F420-41A
COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO
COMPENSADOR ELECTRÓNICO
HORIZONTALIDAD DE RETICULA

LECTURAS	
LE	1.521
m	1.520
mm	2

LE	
1.521	0
1.521	0
m	mm

ERROR DETECTADO

0 mm

TÉCNICO MEQUIPPOS SAS
Este certificado no es válido sin el símbolo de aceptación.



MEQUPOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DEACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

Verifique la validez de este certificado en www.jmequipos.com/consultar-certificados.php
Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.



Distribuidores en Colombia autorizados por:

Medellín: Calle 308 #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - ventas@jmequipos.com

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

LC2

 Conintercer CONSTRUCCIÓN PÚBLICA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

¡Bienvenid@!
 Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES
 Número Póliza: 4005754 Anexo: 8 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Anexo N°	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de PRORROGA
010091070029-93	29/04/2025	11/01/2022	25/03/2028	8	29/04/2025	26/03/2028	
Intermediario	Clave		% Participación		Coseguro Cedido		% Participación
1SEGUROS & FIANZAS LTDA	4003451		100.00				

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE	901.551.201-6	CL 67 NO. 5 - 40	CERÉTÉ, CÓRDOBA	3157381975
Asegurado	NT			
AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.	901.362.452-7			
Beneficiario	NT			
AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.	901.362.452-7			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CL 99 NO. 15 - 60		Ciudad: CERÉTÉ		Total Suma Asegurada	\$ 5.369.097.562,50
Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
CUMPLIMIENTO	14/02/2022	28/07/2025	\$ 2.147.639.025,00	PRIMA	13/06/2025
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	11/01/2022	11/01/2027	\$ 2.147.639.025,00	Otros conceptos	\$ 0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2022	26/03/2028	\$ 1.073.819.512,50	Gastos de expedición	\$ 7.000,00
			N/A		\$ 293.600,67
			Prima total		\$ 1.650.973,37



HDI SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad aseguradora constituida bajo la Ley de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. Recuerde que desde inicios del año 2025, HDI Seguros S.A. se fusionó con HDI Seguros Colombia S.A.


 FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATM BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	RED DE SUPERMERCADOS EXITO SURTAMAX CARUJIA	EFFECTY / SERVICENTREGA PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	PÁGINA WEB http://portal.ciente.hdiseguros.com.co PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS
--	---	---	---

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 1.650.973,37

HDI SEGUROS
 NIT 960.039.968-0
 Calle 72 No 10 - 07
 Bogotá D.C. - Colombia
 Telefonos: (601) 3877950
 RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECARGO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.



Entidad Bancaria / HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

169

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES							
Número Póliza: 4005754		Anexo: 8		Sucursal: TUNIA C.N.H 29			
Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO		Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO		Certificado de
010091070029-93	26/04/2025	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	8	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	PRORROGA
Intermediario		Clave		% Participación	Coaseguro Cedido		% Participación
1SEGUROS & FINANZAS LTDA		4000451		100.00			
DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO							
Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono			
CONSORCIO CONSTRUIREMOS CERETE	901 551 201-6	CL 67 NO. 5 - 40	CERETÉ, CÓRDOBA	3157381075			
Asegurado	Beneficiario						
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.	VARIOS SEGÚN RELACIÓN						
INFORMACIÓN DEL RIESGO							
Riesgo: 1	Ciudad		Departamento: VARIOS				
Dirección:							
Beneficiario		Tipo Doc.		Nro. Doc.			
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.		NIT		901 302 452-7			
Objeto > Ramo > Amparo		Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Índice Variable		
CONTRATO			\$ 5.369.097.562,50		%	Valor	
CUMPLIMIENTO			\$ 5.369.097.562,50				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES			\$ 1.073.819.512,50				
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO			\$ 2.147.639.025,00				
CUMPLIMIENTO			\$ 2.147.639.025,00				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o anexo a ella, contra los riesgos indicados y por los aranceos adicionales establecidos. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. Recuérdese que desde inicios del año 2025, HDI Seguros S.A. se fusionó con HDI Seguros Colombia S.A.


FIRMA AUTORIZADA

Unidad de Atención:	Bogotá: 601 307 70 50	Desde un móvil: 624	  
	Nacional: 018000 113 300	WhatsApp: 316 42 18 02	

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

170

 Conintercer CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CERETE	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

HDI
SEGUROS

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

Número de identificación: 901 551 201-6

Número Poliza: 4005754 Anexo: 8 Sucursal: TUNJA C.N.H. 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LOS AMPAROS CONTRATADOS POR UN PERIODO DE 68 DIAS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE SUSPENSIÓN N°4 CON FECHA DEL 17 DE ENERO DE 2025.

ACTA DE REINICIO N°4 CON FECHA DEL 31 DE MARZO DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS POR UN (01 MES) DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 19 DE ENERO DE 2025, TENIENDO EN CUENTA OTROSI N° 04 AL CONTRATO AQLATAM-ALC-001-2022 CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN OTRO SI #3 CON FECHA DEL 22 DE JULIO DE 2024, SE ADICIONAN CINCO MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS

ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN:

*ACTA DE REINICIO No 3 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.
*ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN OTROSI No 02 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT 901.362.452-7 MUNICIPIO DE CERÉTÉ NIT. 800.095.744-5 Y AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO IDENTIFICADO CON NIT. 900.463.725-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023
ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERÉTÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

171

 Conintercer CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

HDI
SEGUROS

Tomador: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

Número de identificación: 901.551.201-6

Número Póliza: 4005754 Anexo: 8 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ

INTEGRADO POR:

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, CC. 78.034.207, PARTICIPACION DEL 99%
 BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 901.234.686-5 PARTICIPACION DEL 1%
 R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: a nivel nacional 01 8000 113 390, Bogotá 601 307 70 50, celular #224 o traves de WhatsApp +57 316 482 18 02. Obtenga la certificación en <<https://www.hdiseguros.com.co>>

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia

Periodo de reporte:
 Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

172

 Conintercer CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CORDOBA	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS
DE CUMPLIMIENTO**

COMPañÍA ASEGURADORA:

HDI SEGUROS

PÓLIZA No: 4005754
(Anexo 8)

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 - 04 - 2025

INICIAL: ☐

MODIFICACIÓN: ☒

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE

NIT No:

901.551.201-6

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE
COBERTURA DEL SECTOR No.4 ETAPA II
EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR DEL CONTRATO:

DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE
(\$10.738.195.125)

Calle 39 No. 15 - 60 Barrio Venus - Cereté Córdoba, PBX (4) 764 16 02, info.cordoba@aqualia.com

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

123

 Conintercer CONSERVACIÓN INTERCER	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



AMPAROS PACTADOS

GARANTÍAS	(%))	CONDICIONES	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			DESDE	HASTA	ACTUAL	ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	14/02/2022	28/07/2025	\$2.147.639.025.00	\$2.147.639.025.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10%	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS	14/02/2022	26/03/2028	\$ 1.073.819.512.50	\$ 1.073.819.512.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20%	CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	SI AMPARA 5 AÑOS. 0 MESES Y 0 DÍAS.		\$ 2.147.639.025.00	\$ 2.147.639.025.00

Calle 39 No. 15 – 60 Barrio Venus – Cereté Córdoba, PBX: (4) 764 1602, info.cordoba@aqualia.com

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

124

 Conintercer CONSTRUCCIONES	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Revisados los amparos y hecha la verificación y análisis correspondiente de la actualización de la póliza de seguros de cumplimiento No 4005754 ANEXO 8, se aprueba la modificación de la garantía por reunir los requisitos exigidos por AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. para el contrato de obra No AQLATAM-ALC-001-2022 de fecha 11 de enero de 2022 y de conformidad al ajuste de vigencia según Otrosí No.5 en el cual se proroga el plazo del contrato en dos (2) meses.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P NIT No 901.362.452-7.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, Córdoba a los treinta (30) días del mes de abril del año 2025.


ANA MARIA VELLOJIN ARGEL
 Supervisor designado
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE

Calle 39 No 15 - 60 Barrio Venus - Cereté Córdoba, PBX. (4) 764 16 02, info.cordoba@aqualia.com

Periodo de reporte:
 Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

175

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

¡Bienvenid@!
 Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001149 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia 01009107051480	Fecha de Expedición 04/06/2025	Vigencia Seguro Desde las 24 horas [d-m-a] 11/01/2022	Hasta las 24 horas [d-m-a] 07/06/2025	Anexo Nº 9	Vigencia Anexo Desde [d-m-a] 28/03/2025	Hasta [d-m-a] 07/06/2025	Certificado de PRORROGA
------------------------------	-----------------------------------	---	--	---------------	---	-----------------------------	----------------------------

Intermediario: ISEGUROS & FIANZAS LTDA Clave: 4003451 % Participación: 100.00 Coaseguro Cedido: % Participación:

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE	NIT 901.551.201-6	Dirección CL 87 N.O. 5 - 40	Ciudad CERETÉ, CÓRDOBA	Teléfono 3157381075
Asegurado CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE	NIT 901.551.201-6			
Beneficiario TERCEROS AFECTADOS	NIT 999.999.999-0			

PRODUCTO Y PRIMA

Código CIIU 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN.	TOTAL SUMA ASEGURADA \$ 1.073.819.513,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 18/07/2025	
RESP. CIVIL EXT. \$ 1.073.819.513,00	PRIMA NETA \$ 0.00	PRIMA \$ 522.199,90
	OTROS CONCEPTOS \$ 0.00	OTROS CONCEPTOS \$ 0.00
	GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 7.000,00
	IVA \$ 0.00	IVA \$ 100.547,98
	PRIMA TOTAL \$ 0.00	PRIMA TOTAL \$ 629.747,88

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, espaldarones y condiciones contenidas en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. Recuerde que desde el 01 de mayo de 2025, HDI Seguros S.A. se fusiona con HDI Seguros Colombia S.A.


FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATM BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	RED DE SUPERMERCADOS EXITO SURTIDOR CARULLA	EFFECTY / SERVIDENTREGA PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110725	PÁGINA WEB http://portalcliente.hdiseguros.com.co PAGOS CON TARIFA DE CREDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO
--	--	--	---

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 629.747,88

HDI SEGUROS
 NIT 960.031.968-0
 Calle 72 No 10 - 07
 Bogotá D.C. - Colombia
 Teléfonos (601) 3877050
 RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECARGO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.


 (415)7702963000020;0020;01009107051480;3900;000000629748;96;20250719

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

AG

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
Número Póliza: 4001149	Anexo: 9	Sucursal: TUNJA C.N.H 29					
Referencia 010091070514-80	Fecha de Expedición 04/06/2025	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas (d-m-a) 11/01/2022	Hasta las 24 horas (d-m-a) 07/06/2025	Anexo Nº 9	VIGENCIA ANEXO Desde (d-m-a) 28/03/2025	Hasta (d-m-a) 07/06/2025	Certificado de PRORROGA
Intermediario 1SEGUROS & FINANZAS LTDA	Clave 4003451	% Participación 100,00	Cotaseguro Cedido		% Participación		
DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO							
Tomador CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE	NIT 901.951.201-6	Dirección CL 67 NO. 5 - 40	Ciudad CERETÉ, CÓRDOBA		Teléfono 3157381975		
Asegurado CONSORCIO CONSTRUREDES CERETE	Beneficiario VARIOS SEGÚN RELACIÓN						
INFORMACIÓN DEL RIESGO							
Riesgo 1	Cuscut CERETÉ		Departamento CORDOBA				
Dirección: MUNICIPIO DE CERETE							
Beneficiarios		Tipo Doc.		Nro. Doc.			
TERCEROS AFECTADOS		NIT		999 999 999-0			
Objeto > Ramo > Amparo		Valor asegurable	Valor asegurado	Sublímite	Indice Variable		
OBJETO GENERAL			\$ 1.073.819.513,00		% Valor		
RESP CIVIL EXT.			\$ 1.073.819.513,00				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			\$ 1.073.819.513,00				
DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 1.000.000.000 - No inferior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o anejados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. Recuerde que desde inicios del año 2025, HDI Seguros S.A. se fusionó con HDI Seguros Colombia S.A.


FIRMA AUTORIZADA

Línea de Atención: Bogotá: 601 307 70 50 Nacional: 01 8000 113 390	Desde un móvil #224 WhatsApp: 316 262 18 02	www.hdiseguros.com.co
--	--	--

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

177

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRA CON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

Tomador: CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE

Número de identificación: 901.551.201-6

Número Póliza: 4001149 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS POR UN PERIODO DE 2 MESES, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA OTRO SI NO. 5 CON FECHA DEL 07 DE ABRIL DE 2025.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 07 DE JUNIO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LOS AMPAROS CONTRATADOS POR UN PERIODO DE 68 DIAS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE SUSPENSIÓN N°4 CON FECHA DEL 17 DE ENERO DE 2025.

ACTA DE REINICIO N°4 CON FECHA DEL 31 DE MARZO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS POR UN (01 MES) DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 19 DE ENERO DE 2025, TENIENDO EN CUENTA OTROSI No. 04 AL CONTRATO AQLATAM-ALC-001-2022 CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGÚN OTRO SI #3 CON FECHA DEL 22 DE JULIO DE 2024, SE ADICIONAN CINCO MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN SIN SER MODIFICADOS

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESETE ANNEXO DE MODIFICAICON, SE PROROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

*ACTA DE REINICIO No 3 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.

*ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN OTROSI No 02 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. NIT 901.362.452-7 MUNICIPIO DE CERETÉ NIT. 800.096.744-5 Y AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO IDENTIFICADO CON NIT. 900.463.725-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023

ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022

ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Periodo de reporte:

Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

128

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

Tomador: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

Numero de identificación: 901.551.201-6

Numero Póliza: 4001149 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA C.N.H.29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. AQLATAM-ALC-001-2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO CONSTRUREDES CERETÉ

INTEGRADO POR:

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, CC.78.034.207, PARTICIPACION DEL 99%
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT.901.234.686-5 PARTICIPACION DEL 1%
R/LEGAL: JORGE IVAN ECHEVERRY SOTO C.C. 1.067.838.399

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION DE LA OBRA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: a nivel nacional 01 8000 113 390, Bogotá 601 307 70 50, celular #224 o través de WhatsApp +57 316 482 18 02 Obtenga la certificación en <<https://www.hdiseguros.com.co>>

VIGILADO EN SU PRESTACION POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

179

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



**CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.**

COMPañÍA ASEGURADORA:	HDI SEGUROS
PÓLIZA No: 4001149 (Anexo 09)	FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 - 06 - 2025
INICIAL: ☐	MODIFICACIÓN: ☒
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUEDES CERETE
NIT No:	901.551.201-6
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR N.º 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$10.738.195.125)

Calle 39 No. 15 - 60 Barrio Venus - Cereté Córdoba, PBX: (4) 764 16 02, info.cordoba@aqualia.com

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

100

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



AMPAROS PACTADOS

GARANTÍAS	(%)	CONDICIONES	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			DESDE	HASTA	ACTUAL	ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	10%	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	11/01/2022	07/06/2025	1.073.819.513,00	1.073.819.513,00

Revisados los amparos y hecha la verificación y análisis correspondiente de la actualización de la póliza No 4001149 anexo 9, se aprueba la modificación de la garantía por reunir los requisitos exigidos por AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P, para el contrato de obra No AQLATAM-ALC-001-2022 de fecha 11 de enero de 2022 y de conformidad al ajuste de vigencia según Oficio No.5 en el cual se proroga el plazo del contrato en dos (2) meses.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P NIT No 901.362.452-7.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, Córdoba a los cuatro (04) días del mes de junio del año 2025.


 MARIA VELLOJIN ARCE
 Supervisor designado
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE

 Conintercer CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

182

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

SEGUROS DEL ESTADO S.A.									
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL									
DECRETO 1082 DE 2015									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53		NO POLIZA 53-44-101019572	
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO 21 05 2025			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 31 01 2022			ALAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 16 06 2028	
						ALAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTER Z4 CERETE						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1			
DIRECCIÓN CL 22 D 16 99 OF 1						CIUDAD MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO 3146304480	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7			
DIRECCIÓN CL 80 NRO 11 - 42 SUR OF 401						CIUDAD BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 7461626	
ADICIONAL									
OBJETO DEL SEGURO									
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:									
AMPARAN EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE AL INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR NO. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.									
CONTRATO NO. AQLATAM-ALC-002-2022.									
AMPAROS									
RIESGO: INTERVENTORIA									
AMPAROS									
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR			
31/01/2022		16/10/2025		5147,709,121.63		5147,709,121.63			
31/01/2022		16/11/2025		573,854,560.81		573,854,560.81			
31/01/2022		16/06/2028		573,854,560.81		573,854,560.81			
ACLARACIONES									
RESISTANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS:									
ACTA DE SUSPENSIÓN N 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. AQLATAM-ALC-002-2022, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025.									
ACTA DE RESCISO N 4 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2025.									
OTROSI NO. 04 AL CONTRATO AQLATAM-ALC-002-2022, DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2025.									
PODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOR CONTINUAN VIGENTES.									
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL	
\$ *****273 160 00		\$ *****8 000 00		\$ *****53 420 00		\$ *****334 581 00		\$ *****295 418 243 25	
								CONTADO	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO									
NOMBRE		CLAVE		% DE PART		NOMBRE COMPAÑIA		% PART	
MARITZA ELENA ARISAUD CHEJNE		153644		100.00					
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.									
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813210 - MONTERIA									
  									
53-44-101019572 FIRMA AUTORIZADA: José Luis Gueda - Vicepresidente de Finanzas FIRMA TOMADOR									
ESTO PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL AUTOPISTA NORTE #103-66 P.O. TELEFONO: 801-818071 801-4010336 DL 15338664									

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

153

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba


 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015															
CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA		SUCURSAL AGENCIA MONTERIA		COD SUC 53	Nº PÓLIZA 53-44-101019572												
ANEXO 8																	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 05 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 06 2028	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE					IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1												
DIRECCIÓN CL 22 D 16 99 OF 1			CIUDAD MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO 3146304480												
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																	
ASEGURADO / BENEFICIARIO AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.					IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7												
DIRECCIÓN CL 80 NRO. 11 - 42 SUR D 401			CIUDAD BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 7461626												
ADICIONAL																	
Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas: www.segurosdelestado.com www.segurosdevidadelestado.com Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud: Acceso a la información		CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO     CORRESPONSALES BANCARIOS         PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias  Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189  Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445															
VALOR PRIMA NETA \$ ****273.160 00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8.000 00	IVA \$ *****53.420 00	TOTAL A PAGAR \$ *****334.581 00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****295.418.243 25	PLAN DE PAGO CONTADO												
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO														
NOMBRE MARITZA ELENA ABISMAID CHEJNE	CLAVE 153664	% DE PART 100,00	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO												
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO																	
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELÉFONO 7813230 - MONTERIA																	
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CHEQUE No.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						BANCO	CHEQUE No.	VALOR	EFFECTIVO			CHEQUE			TOTAL \$		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR															
EFFECTIVO																	
CHEQUE																	
TOTAL \$																	
 REFERENCIA PAGO: 1101580183661-7 (425 17709990221671W020111012N0383661713905)0000003765811N120230131																	
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE																	

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

184

	Informe Final	Versión 1
		Código AQLATAM-ALC-002-2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 etapa II en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015					
Ciudad de Expedición MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA		COD.SUC 53	NO.POLIZA 53-44-101019572	ANEXO 8
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 05 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 01 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 06 2028	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTER 24 CERETE						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.553.798-1	
DIRECCIÓN CL 22 D 16 99 OF 1				CIUDAD MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO 3146304480	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO							
ASEGURADO / BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.362.452-7	
DIRECCIÓN CL 80 NRO 11 - 42 SUR DT 301				CIUDAD BOGOTÁ D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 7451626	
ADICIONAL:							
TEXTO ACERCA DEL RIESGO							
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL: MONSIE CONSTRUCCIONES CABALLERO S.A.S. JSL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS							
				IDENTIFICACIÓN 900723310-8 901371210-1	PARTICIPACIÓN 30.00 70.00		
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.							
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO 2 - 17 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA							
 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas				 FIRMA TOMADOR			
53-44-101019572				2			

Periodo de reporte:
Del 01 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025

185

**CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS
DE CUMPLIMIENTO**

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No: 53-44-101019572
(Anexo 08)

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 - 05 - 2025

INICIAL: ☐

MODIFICACIÓN: ☒

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER Z4 CERETE

NIT No:

901.553.798-1

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
REDES DE ALCANTARILLADO Y
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL
SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO
DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

VALOR DEL CONTRATO:

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON
TRECE CENTAVOS PESOS M/CTE
(\$738.545.608,13)

AMPAROS PACTADOS

GARANTÍAS	(%)	CONDICIONES	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			DESDE	HASTA	ACTUAL	ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	31/01/2022	16/10/2025	\$147,709,121.63	\$147,709,121.63
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10%	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS	31/01/2022	16/11/2025	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS.	31/01/2022	16/06/2028	\$73,854,560.81	\$73,854,560.81

Revisados los amparos y hecha la verificación y análisis correspondiente de la actualización de la póliza de seguros de cumplimiento No 53-44-101019572 ANEXO 8, se aprueba la modificación de la garantía por reunir los requisitos exigidos por AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P, para el contrato de obra No AQLATAM-ALC-002-2022 de fecha 11 de enero de 2022 y de conformidad al ajuste de vigencia según Otrosí No. 04 en el cual se prórroga el plazo del contrato en dos (02) meses

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P NIT No 901.362.452-7.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, Córdoba a los veintidós (22) días del mes de mayo del año 2025.

ANA MARIA VELLOJIN
ANA MARIA VELLOJIN ARGEL
 Supervisor designado
 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE
